Métodos de planificación de proyectos

Es casi universalmente popular tomar como referencia a otras organizaciones y buscar en ellas las mejores prácticas que utilizan para que la propia organización pueda copiarlas para ser más eficaz, previo a un análisis de las mismas.

Un error común es creer que los procesos en sí mismo deben ser la base para determinar la mejor práctica, sin relacionar esos procesos a la **creación interna de valor.**

Si uno busca una organización o metodología como referencia, debería asegurarse de que las metas y objetivos de la institución referente sean similares a la suya y que los procesos que se tomarán como modelo sean adecuados y funcionarán dentro de su organización.






Simplificación de procesos

Necesidad de repensar

Si los procesos que actualmente utiliza para la gestión de proyectos o los que se propone implementar resultan en más trabajo que el proyecto mismo, evidentemente usted necesitará repensar o simplificar dichos procesos.

Procesos propietarios


Eso ocurre frecuentemente con procesos propietarios o metodologías desarrolladas que no tienen en cuenta aspectos más ágiles del negocio.

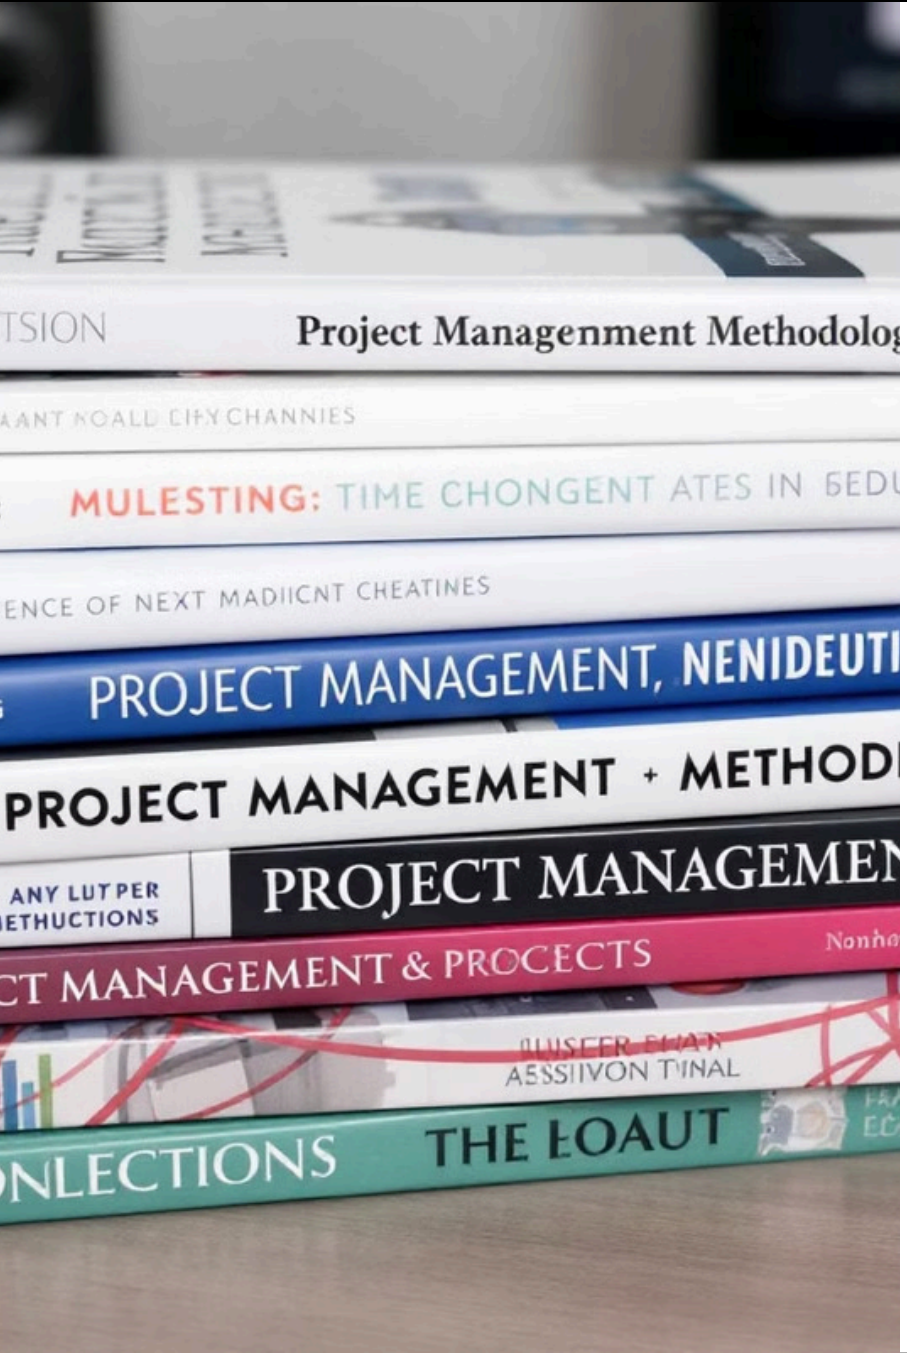

Experiencia con metodologías complejas

> "Recuerdo un proyecto en donde me tocó trabajar con otros consultores de la ex Arthur Andersen quienes utilizaban "Method/1". Si bien ellos me dieron acceso a dicha metodología francamente nunca la leí, pero puedo asegurar que ocupaba toda una biblioteca, y uno debería tener mucho tiempo para poder leer todos esos libros en menos tiempo del que se necesitaba para llevarlos a la práctica."

No se discute el proceso sino su usabilidad. Cualquier proceso o metodología que ayude en el trabajo es bueno, con tal que, genere valor al cliente y no sea excesivamente pesado.

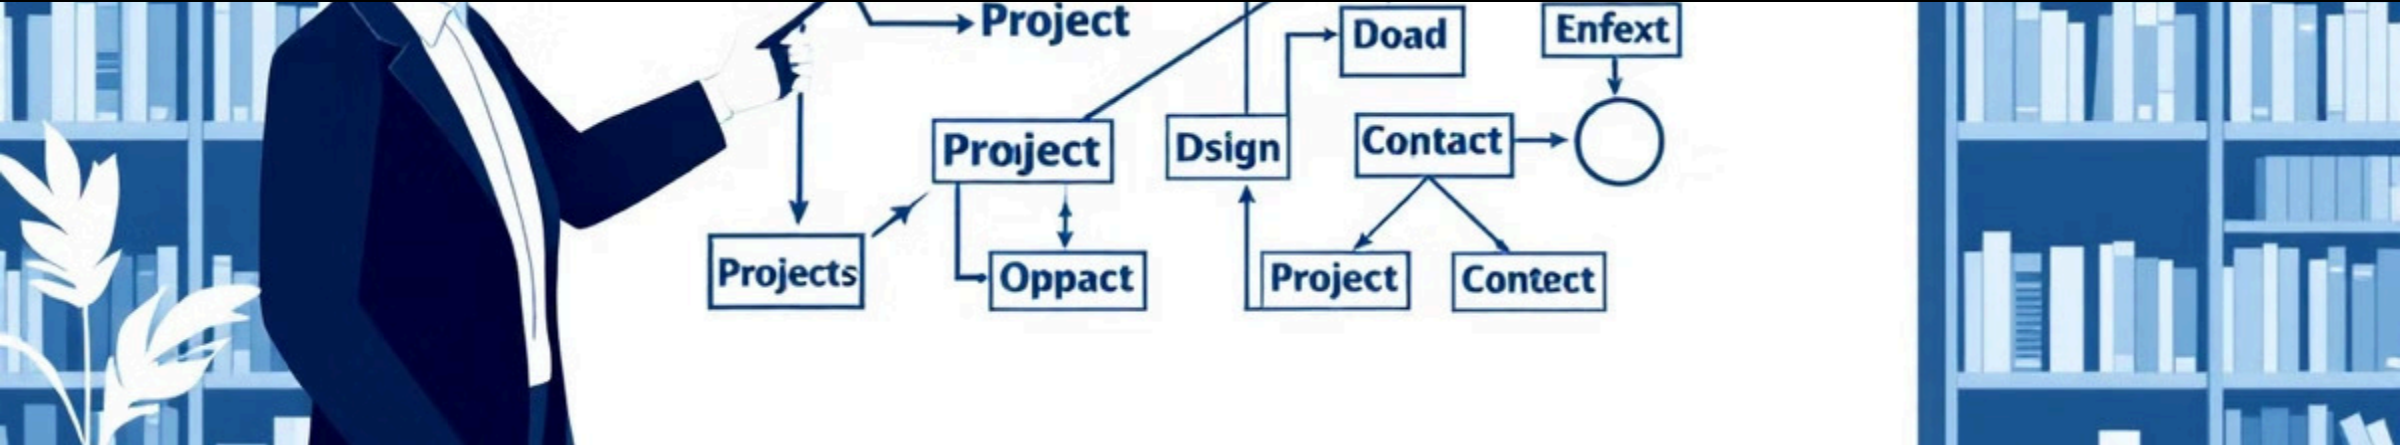


Mejores prácticas en gestión de proyectos

1 Para asegurar el éxito en la gestión de proyectos se necesita recurrir a las mejores prácticas del mercado y no re-inventar la rueda.

2 Los procesos o métodos de mejores prácticas deberían ser una biblioteca de toda la experiencia pasada de una organización en la ejecución de sus proyectos.

3 Estos deberían ser modulares de manera de poder adaptarlos a los distintos tamaños o complejidades de los proyectos.

4 La biblioteca de las mejores prácticas se construye realizando los análisis post-mortem o lecciones aprendidas y documentando esa información para la mejora continua de los mismos.

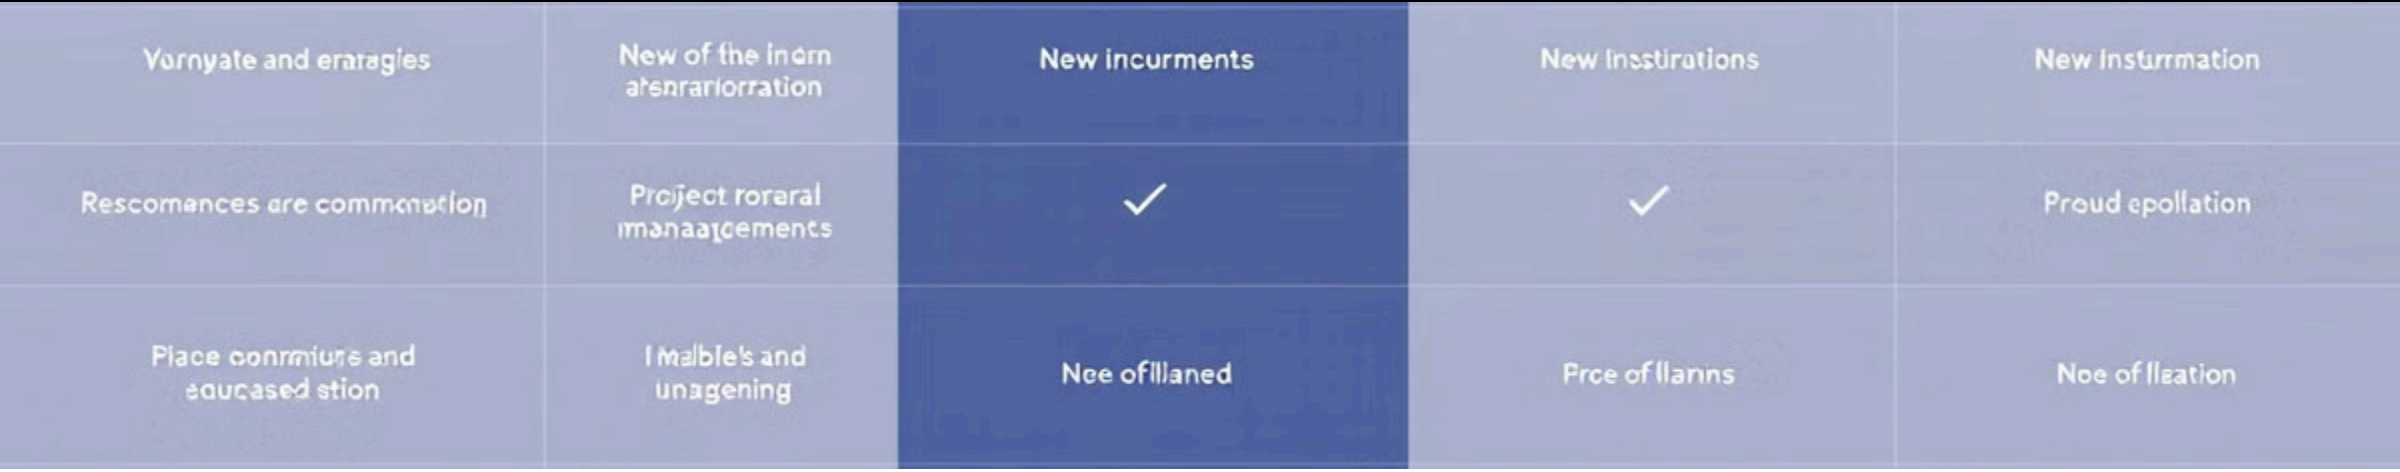


Metodologías de referencia

PMBOK®

El material de referencia estándar es el PMBOK® del Project Management Institute con información muy detallada acerca de los procesos para la gestión de proyectos.

Otras normas

Otras normas o metodologías tales como ISO, CMMI, Prince 2, APM, etc. son otras fuentes de información y las propias de la industria IT: SCRUM, Kanban, Lean y Extreme Programing.

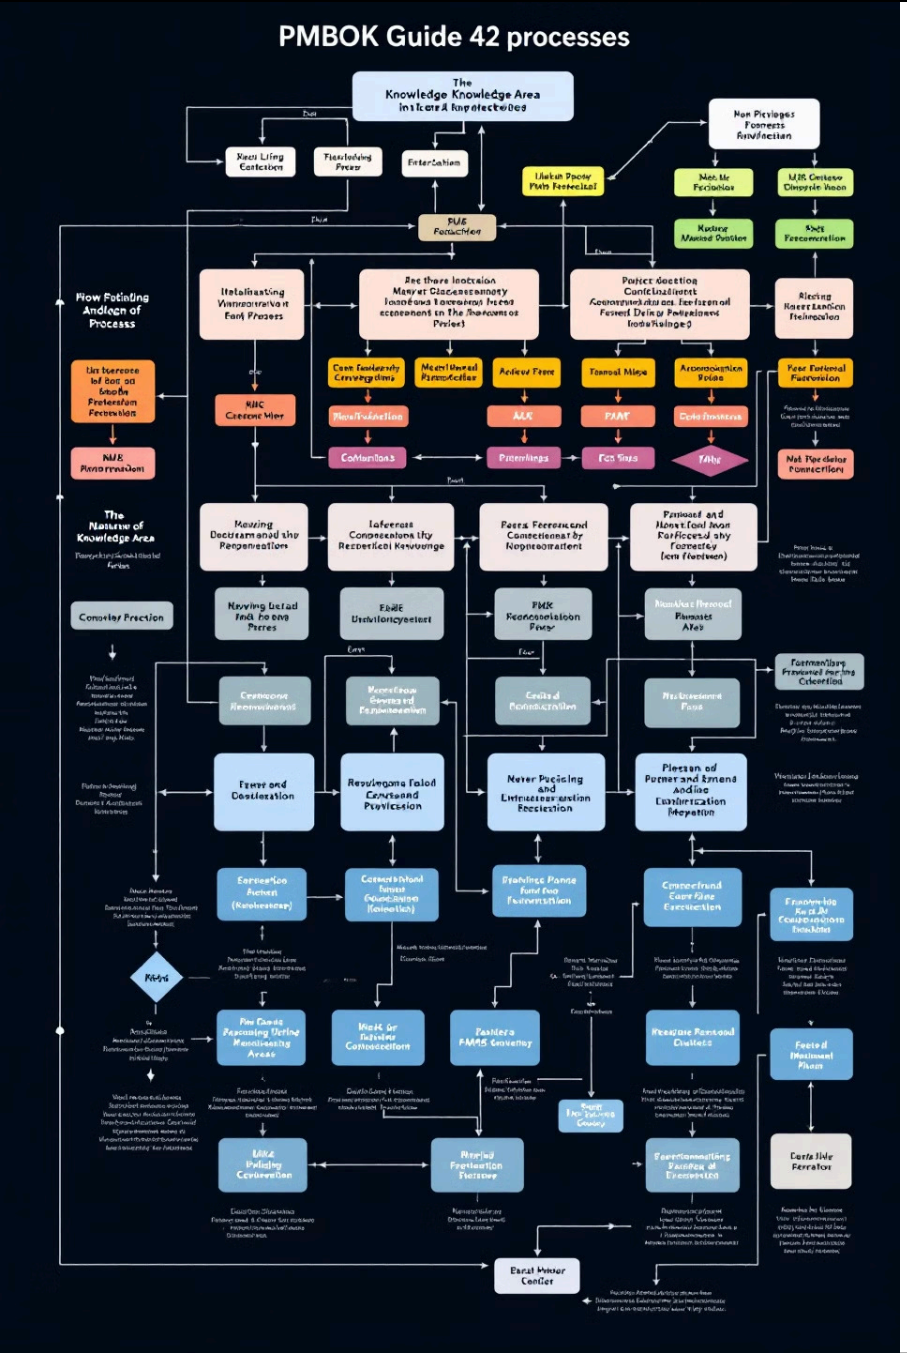

PMBOK®

Se trata de una metodología tradicional y completa para el desarrollo de un proyecto.

1. El PMBOK® distribuye las mejores prácticas en 42 procesos y 9 áreas de conocimiento o disciplinas.

2. En la práctica muchos proyectos no utilizan ni la mitad de esos 42 procesos, sin embargo a los efectos educacionales el PMBOK® provee la más clara y profunda explicación de las distintas áreas que envuelven a la gestión de cualquier proyecto.

3. La flexibilidad es muy importante aquí.

4. Utilizar el sentido común, la experiencia y la intuición es crucial para decidir qué procesos son los que conviene aplicar en cada proyecto .

1 - Seguir un proceso de iniciación estructurado

Estudio de factibilidad

Realizar un estudio de factibilidad financiero, tecnológico, de recursos, impactos, estratégico y de negocio del proyecto.

Evaluación de riesgos

Durante la fase de inicio o arranque, una correcta valoración de riesgos, asunciones, obstáculos y restricciones deben ser convenientemente evaluados.

Valoración de requerimientos

El factor crítico es realizar un adecuado proceso de valoración de requerimientos (RM) para clarificar objetivos, necesidades y alinear las expectativas.





Importancia de los stakeholders

1. Todas las metodologías de administración de proyectos recalcan la importancia de una fuerte relación con los stakeholders y su proceso de análisis, dado que con ellos podremos lograr más fácilmente el éxito y romper muchas barreras en los proyectos.


2. Un error frecuente es que muchos proyectos pueden tener muchos stakeholders y el team sólo dialoga con aquel más sociable y entusiasta sin evaluar las expectativas de los otros que directa o indirectamente están involucrados y son precisamente los que pueden ponernos los palos en la rueda.



Relación con stakeholders

Negociación

Habilidad de negociar y manejar las expectativas y necesidades de los stakeholders afectados por el proyecto.

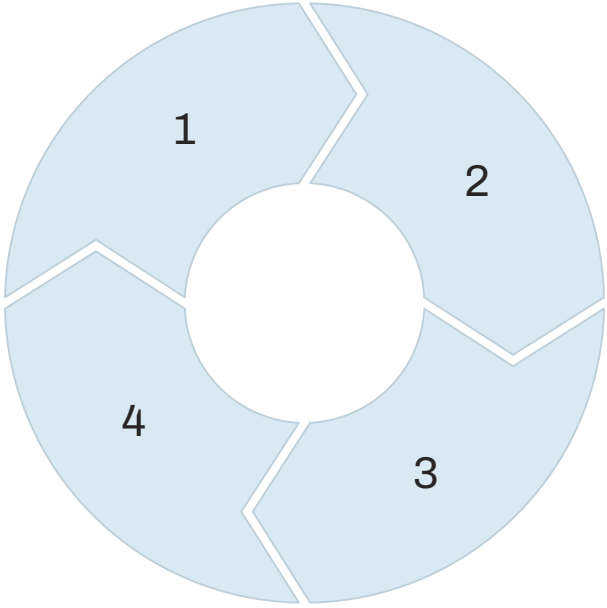

Conexión emocional

Establecer una buena "relación" lo que implica más que identificar y manejar sus expectativas, manejar una conexión emocional con la gente.

Comunicación fluida

Asegurarse de que todos los stakeholders están a bordo del proyecto manteniendo fluida comunicación con ellos.

Habilidades interpersonales

El PM debe focalizarse en mejorar sus habilidades interpersonales.

2 - Planificación del Proyecto

En el mundo del desarrollo de software, las metodologías ágiles, como "Agile Development", han surgido para adaptarse a la singularidad de estos proyectos, marcando un cambio respecto a las prácticas tradicionales.

Metodologías tradicionales

En la planificación tradicional, el énfasis se pone en definir cada detalle del proyecto con precisión desde el principio. Se busca tener un plan exhaustivo y completo antes de comenzar la ejecución.

Este enfoque se basa en la premisa de que es posible anticipar y definir con exactitud los requisitos del proyecto. Sin embargo, en entornos dinámicos y cambiantes, esta rigidez puede ser un problema, ya que los requisitos evolucionan constantemente.

Metodologías ágiles

En contraste, las metodologías ágiles, como Agile Development, se caracterizan por una planificación más flexible y adaptativa. Estos enfoques trabajan en ciclos iterativos, obteniendo retroalimentación constante de los usuarios y ajustando el rumbo según sea necesario.

La agilidad y capacidad de adaptación se han vuelto fundamentales en el entorno dinámico del desarrollo de software, permitiendo a los equipos responder rápidamente a los cambios y entregar valor continuo a los clientes.

Aspectos clave de la planificación

1. Planes comprensivos, realistas y bien comunicados son imprescindibles en todos los proyectos, aún con cortos ciclos de vida.

2. Involucrar no sólo al team sino a los stakeholders en el desarrollo de los planes.

3. Discutir acerca de todos los objetivos y entregables del proyecto y explicar claramente los riesgos involucrados son también factores esenciales.

4. No embarcarse en planificaciones extensas, construir planes a corto plazo y detallados (elaboración progresiva según el mismo PMBOK®), e ir elaborando los requerimientos sobre la marcha en una aproximación de tipo iterativo.





3 - Auditorías

Evaluación de salud del proyecto

Para evaluar la salud del proyecto, deberían realizarse auditorías y reuniones de "quality assurance" en forma frecuente.

Chequeo de entregables

Chequear no sólo los entregables sino el estado y progreso del proyecto.

Medición del progreso

Medir el progreso real versus el costo y tiempo estimado es muy importante, al igual que realizar mediciones de calidad respecto del cumplimiento de los requerimientos y el alcance de los entregables.



Importancia de las métricas

> No podemos controlar y mucho menos mejorar si no tenemos métricas.

Debemos desarrollar criterios estándar de medición tanto de calidad como de productividad y eficiencia, para saber no sólo dónde estamos sino qué y cómo debemos mejorar.

Actividades de Monitoreo y Control

Debemos desarrollar criterios estándar de medición tanto de calidad como de productividad y eficiencia, para saber no sólo dónde estamos sino qué y cómo debemos mejorar.



Control del progreso

Tiempo y tareas



Control del alcance

Cambios



Control del rendimiento

Performance



Control de los costos

Método del valor ganado



Control de calidad

Etapas de una auditoría

1

Planificación

Elección del tipo de auditorías a realizar, determinar los procedimientos a utilizar, elección del personal, fijación de su periodicidad.

2


Realización

Realización de auditorías según procedimiento y plan definidos. Se trata de auditar la efectividad de la gestión del proyecto, tanto a través del grado de cumplimiento de los procesos, como a través de la calidad del producto obtenido.

3

Evaluación

Evaluación de los resultados de la auditoría. Lo que se pretende es la obtención de una valoración totalmente objetiva por lo que el sistema de valoración ha de ser consensuado, y además, experimentado durante cierto tiempo, para poder fijar las señales de alerta, índices de ponderación, etc.

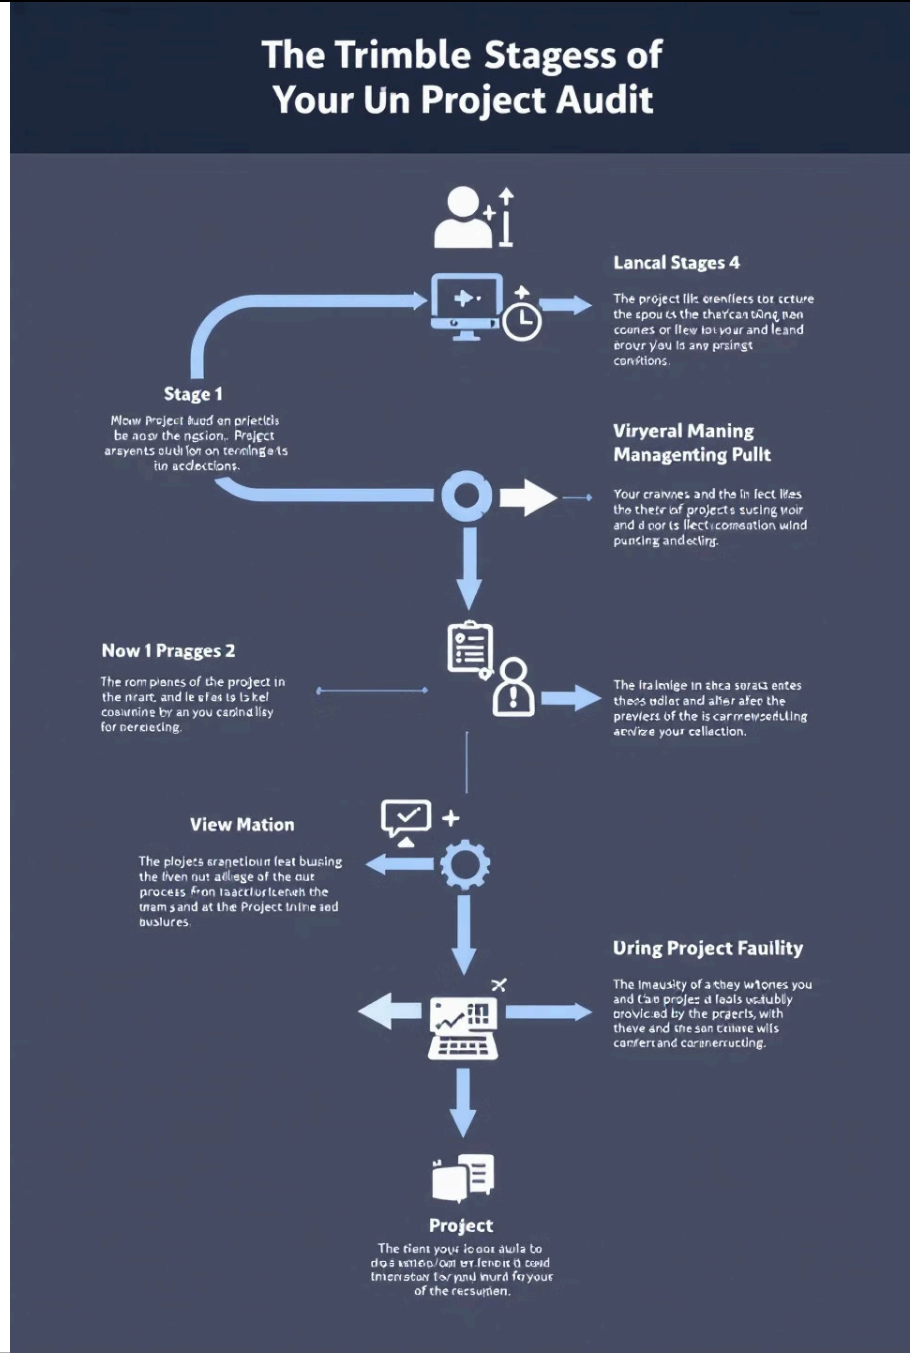

4 - Utilización de recursos humanos

Problemas comunes en la gestión de recursos

1. La no disponibilidad de los recursos claves (algo frecuente en los proyectos de alta tecnología).
2. La demanda puede ser superior a la oferta y los planes suelen subestimar el tiempo requerido para adquirir estos recursos.
3. El tiempo necesario para organizar el grupo ("team building").
4. Sobrecarga laboral más allá de lo pactado y los posibles conflictos asociados.






5 - Estimación de Costos y Tiempos

> Las estimaciones de costos y tiempos en un proyecto constituyen la parte más difícil en la planificación, y es más un arte que una ciencia.

Lamentablemente muchas organizaciones venden sus proyectos de acuerdo a lo establecido por Ventas y no tienen tiempo de realizar una estimación bottom-up o utilizar buenas técnicas de métodos cuantitativos de administración de proyectos para al menos estimar las variaciones e incertidumbres con los buffers de contingencias necesarios.

Relación entre tamaño del proyecto y éxito

El Standish Group a través de sus estudios empíricos nos arroja estos resultados de éxito/fracaso de proyectos en su relación con su tamaño y duración.

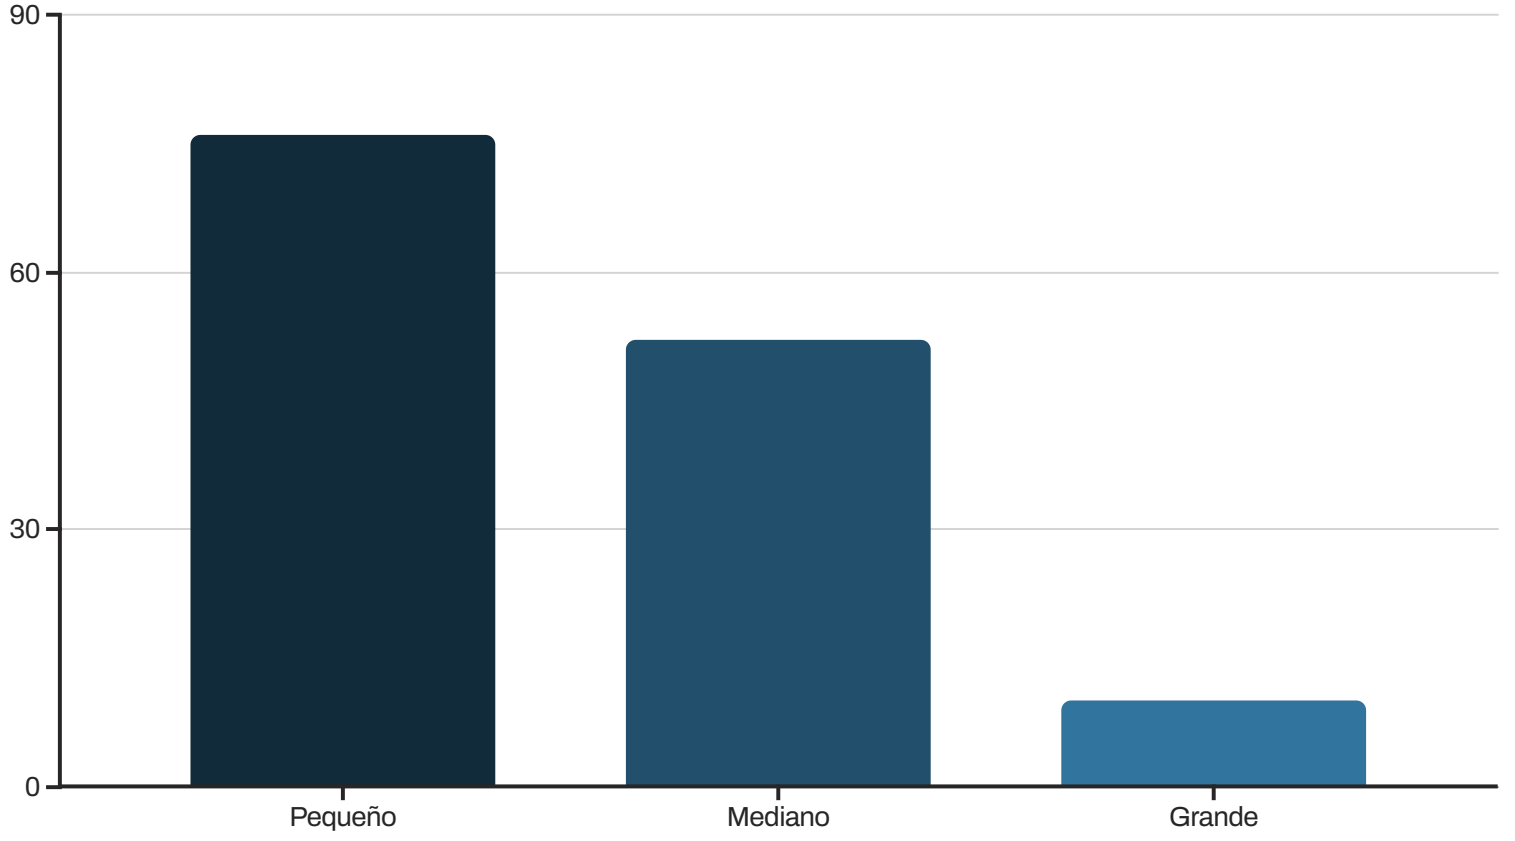

Esto nos demuestra una vez más que los mega-proyectos pasaron de moda y que el desarrollo iterativo es el mejor método para mitigar riesgos y una estrategia buena para estimar mejor el alcance, costo y tiempo de los entregables a distribuir en el proyecto.


6 - Practicar un estricto control de cambios

El propósito de la administración de cambios es proteger la viabilidad de la definición del proyecto ya definida y aprobada.

1 Independientemente del tamaño del proyecto y para evitar el "Scope Creep[1]" se deberá ser muy riguroso en lo que respecta al control y seguimiento de los cambios al proyecto.

2 Tener muy claro el procedimiento para solicitar los cambios, el tipo de formulario, como debe ser completado y el método para aprobación respectivo.

3 En algunos proyectos es imposible anticipar todas las solicitudes y requerimientos durante el proceso de análisis y siempre podrá existir la posibilidad y la necesidad de incorporar cambios durante el ciclo de vida. Estos cambios pueden ser muy necesarios para la solución, y pueden existir razones poderosas de negocio por las que deberían incorporarse.

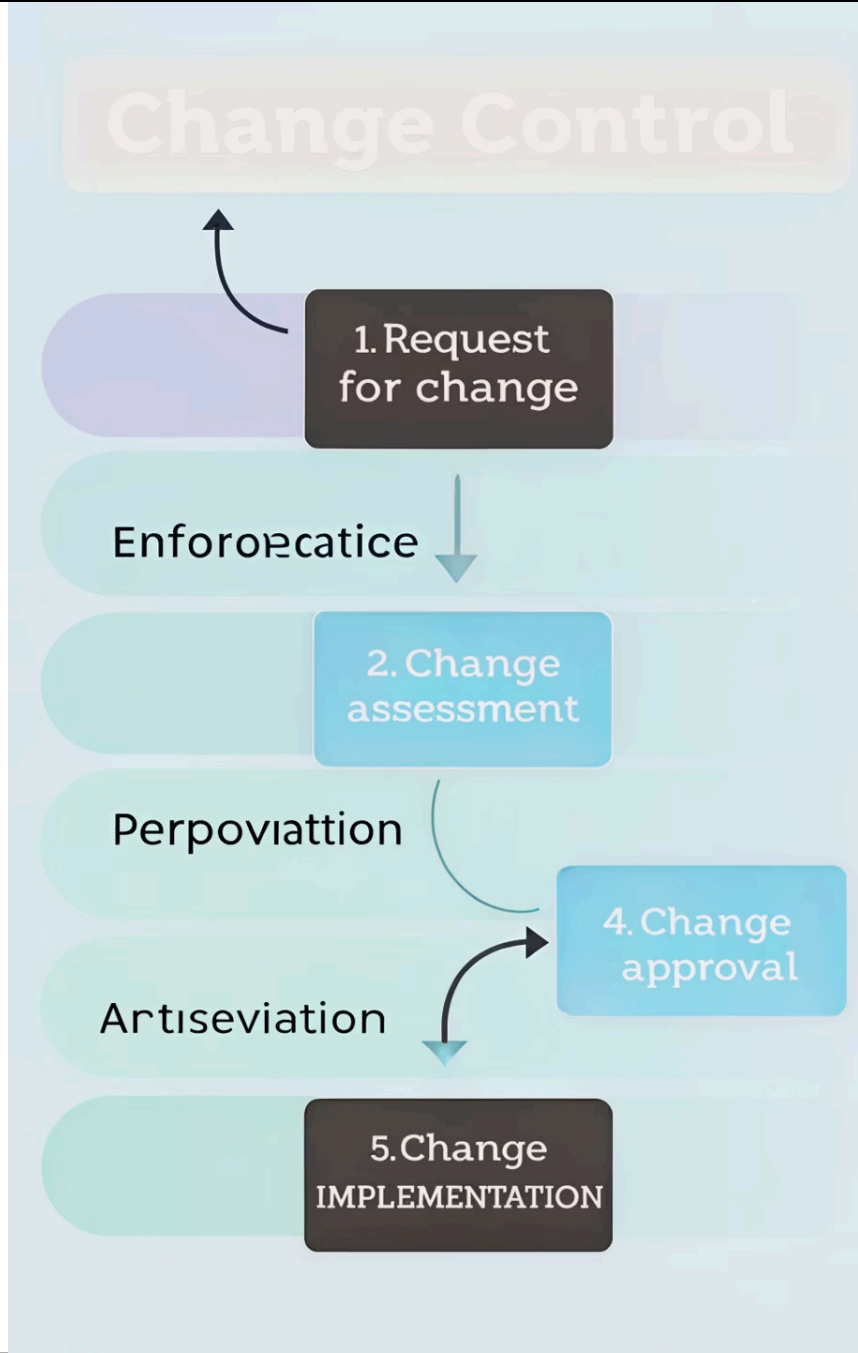

Importancia de la definición del alcance

> Si el Gerente de Proyecto no ha definido bien el alcance inicial del proyecto, será tremendamente difícil administrar el mismo.

Cuando se solicita formalmente un cambio, implica que dicho cambio está fuera del alcance acordado en la definición del Proyecto o de los requerimientos o solicitudes detallados durante el análisis. Si dicho alcance es confuso, poco claro, o deja lugar a interpretaciones, entonces el cliente dirá que el cambio está dentro del alcance, y el Gerente de Proyecto encontrará difícil apegarse a un proceso formal de Gestión de Alcance.

