Definición del proyecto y sus objetivos

La definición del proyecto es un paso crucial que establece las bases para todo el trabajo futuro. Incluye la formulación de los objetivos del proyecto y las especificaciones asociadas.

1. Elementos de la definición
2. Informe del proyecto
3. Especificaciones del proyecto
4. Objetivos generales y específicos
5. Alcance del proyecto

Especificaciones del proyecto

La especificación del proyecto describe cualquier documento que sea una declaración obligatoria de los procedimientos o procesos que se aplican al proyecto. Es una declaración de la política del proyecto.

> El informe del proyecto es un resumen ejecutivo de su proyecto que, cuando se combinó con la cartera de negocio, se convierte en un documento de proyecto.




Definir el proyecto: Proceso clave

La definición es el proceso de convertir los datos en algo que ya no es sólo un deseo o una esperanza. Si no se consigue dar el tiempo adecuado a esta actividad y obtener todos los datos relevantes, el resultado será un proyecto mal definido con una posibilidad considerablemente reducida de alcanzar el éxito.

1. Aspectos importantes
2. Involucrar a todo el equipo en el proceso de definición
3. Aumentar la aceptación y compromiso con el trabajo del proyecto
4. Asegurar una definición clara y sin ambigüedades
5. Evitar confusiones por múltiples aportaciones de los accionistas

Elementos clave en la definición del proyecto

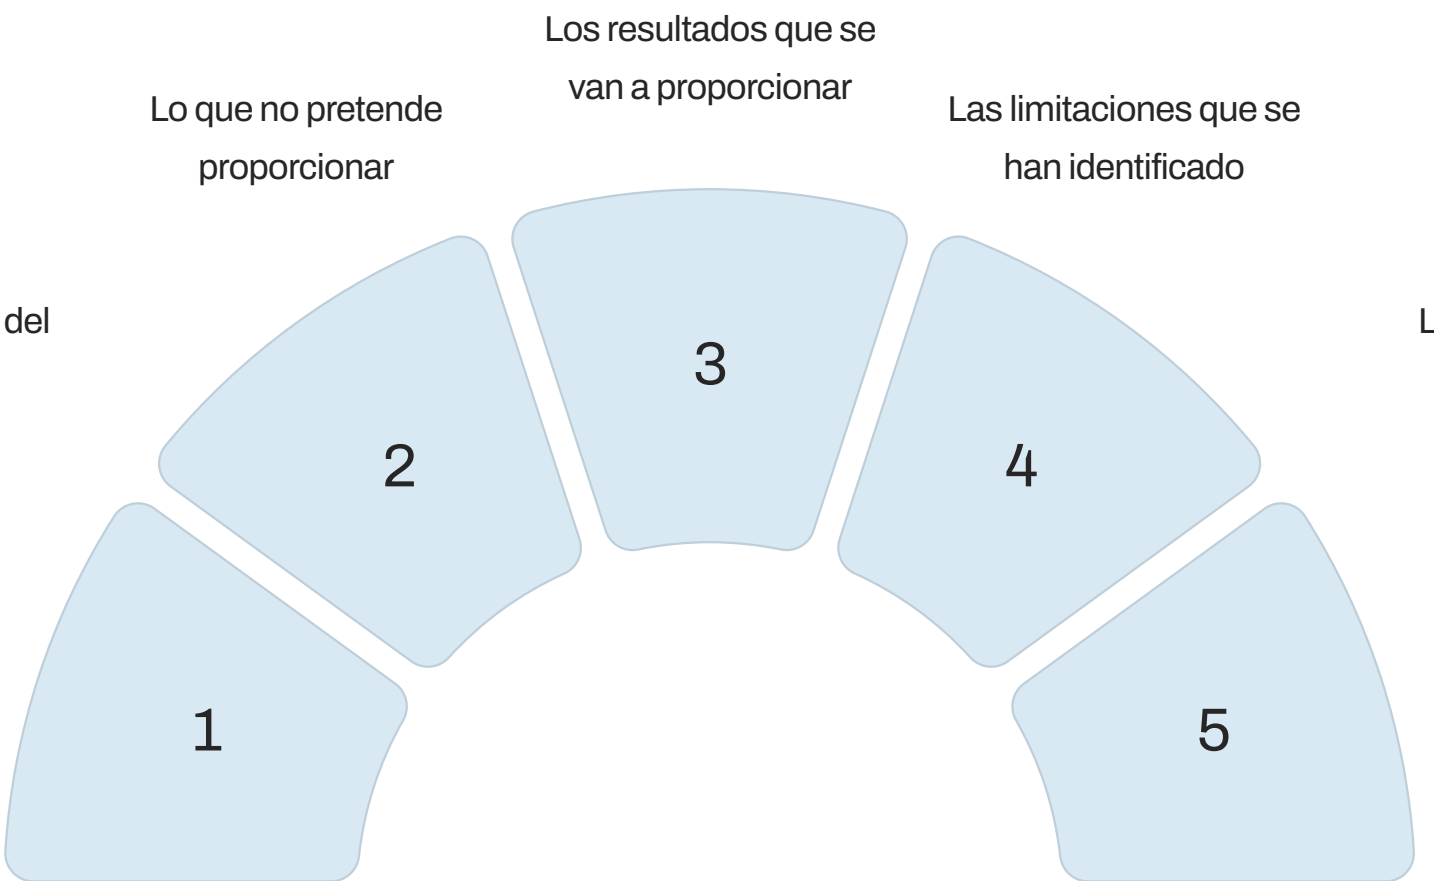

El objetivo es utilizar los datos recogidos sobre las necesidades y expectativas del cliente, convertirlos en requisitos, y obtener una definición de proyecto que satisfaga esos requisitos. Esta definición debe ser aprobada por el cliente y el patrocinador.



Declaración de los objetivos del proyecto

Objetivo general

El objetivo general expresa el resultado final global que se espera del proyecto, debe ser claro y concreto, es conveniente que la definición de un objetivo comience con un verbo en su infinito y que los resultados estén cuantificados.

Desarrollar una solución tecnológica informática y de comunicaciones en 25 semanas con el fin de agilizar los procedimientos de comunicación del cuerpo de ventas del interior con la casa central, de manera tal que dicha agilización produzca una merma del 30 por ciento en los pedidos rechazados por falta de stock y un aumento del 20 por ciento en la facturación anual.

Objetivos específicos del proyecto

En ellos se expresan una desagregación del objetivo general en resultados concretos que puedan ser identificados y cuantificados en forma individual. Estos objetivos específicos son fundamentales para poder medir el progreso y el éxito del proyecto. **Deben ser claros, medibles y alcanzables dentro del plazo y presupuesto establecidos.** Cada objetivo específico debe tener indicadores que permitan evaluar su cumplimiento de manera objetiva.

1. Desarrollar un sistema informático que cumpla con los requerimientos funcionales para asegurar su óptima utilización en el servidor web de la empresa, de manera tal que se ingrese vía Internet por parte de los vendedores y esté integrado al sistema central de facturación y stock.

2. Montar un esquema de infraestructura de hardware y dispositivos telefónicos de acceso al web con el fin de asegurar que la tasa de ocupación sea menor al 10 por ciento de los intentos de acceso por parte de los vendedores.

3. Generar un cambio de cultura por parte del equipo de ventas y el personal de la casa central, sobre la importancia de este nuevo esquema de trabajo y las ventajas que esto implica para la empresa y los clientes.

Consideraciones sobre los objetivos específicos

Los objetivos específicos son la desagregación del objetivo general en resultados concretos que puedan ser identificados y cuantificados individualmente. Esto permite tener una visión más detallada y controlada de las metas a alcanzar.

Al definir los objetivos específicos, es importante tener en cuenta que deben ser realistas y estar alineados con los recursos y el alcance del proyecto. Deben ser lo suficientemente específicos para orientar el trabajo, pero a la vez lo suficientemente flexibles para adaptarse a posibles cambios o imprevistos.

1. Deben ser compartimientos lo más enquistados posibles, cerrados, de fronteras claramente distinguibles
2. Identificar cuáles subproductos tienen la posibilidad de correr en paralelo y cuáles no
3. Considerar la posibilidad de que el cliente necesite alterar la secuencia presentada del proyecto
4. Informar al cliente sobre qué objetivos o etapas pueden ser reordenados y cuáles no
5. Explicar las implicaciones de cambios en la secuencia del proyecto

Elementos de la declaración de objetivos del proyecto

1. Una declaración del entorno
2. El objetivo del proyecto: ¿por qué estamos haciendo esto ahora?
3. El objetivo del proyecto en 25-30 palabras
4. Los productos primarios del proyecto, con las fechas esperadas de entrega
5. Los principales beneficios que se pueden conseguir, cuantificados financieramente
6. El coste del proyecto
7. Qué capacidades se requieren, particularmente aquellas que no se tienen de momento
8. Cualquier interrelación con otros proyectos activos



Test SMART para objetivos del proyecto

El test SMART es una herramienta muy útil para definir objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo de tiempo determinado. Este enfoque ayuda a asegurar que los objetivos del proyecto sean claros, concretos y puedan ser evaluados de manera efectiva.

Cada letra del acrónimo SMART representa un criterio importante a tener en cuenta al formular los objetivos:

1. **S**pecífico: El objetivo debe ser claro y concreto, evitando ambigüedades.
2. **M**edible: Debe ser posible cuantificar o medir el progreso hacia el logro del objetivo.
3. **A**lcanzable: El objetivo debe ser realista y factible de cumplir con los recursos disponibles.
4. **R**elevante: El objetivo debe estar alineado con los objetivos generales del proyecto y la estrategia de la organización.
5. **T**empo: El objetivo debe tener un plazo de tiempo definido para su cumplimiento.

Aplicar el test SMART a la definición de los objetivos específicos del proyecto asegura que sean claros, medibles y alcanzables, lo cual facilita su seguimiento y evaluación a lo largo del desarrollo del proyecto.

Asegúrese de que todos los productos y beneficios satisfacen los siguientes puntos que forman el test de SMART:

Declaración del ámbito del proyecto

Este documento incluye otros datos útiles y referencias a informes anteriores y proyectos relevantes. Debe contener:

1. Los límites definidos del proyecto: lo que usted no va a hacer
2. Los estándares y especificaciones que pueden ser aplicados
3. Especificaciones internas y externas del producto
4. Estándares obligatorios impuestos por la legislación
5. Especificaciones del proceso y del cliente
6. Procedimientos estándar de funcionamiento y de compra
7. Estándares de calidad y procedimientos de pruebas
8. Términos de subcontratación y condiciones impuestas a terceros
9. Cualquier excepción a estos estándares
10. Dónde se guardan los estándares y las especificaciones para referencia
11. Cómo se va a medir el éxito
12. Suposiciones que se hacen en el proyecto

Aprobación de la definición del proyecto


El último paso en el proceso de definición de un proyecto es presentar al patrocinador del proyecto y a su cliente toda la documentación necesaria para obtener la aprobación y pasar a la fase de planificación.

1. Confirmar la alineación estratégica
2. Estudiar la cartera de negocio
3. Comprobar que no se requieran cambios importantes que influyan en la viabilidad del proyecto
4. Presentar toda la documentación al patrocinador y al cliente
5. Obtener la aprobación formal para pasar a la fase de planificación

Lista de verificación para la definición del proyecto

Antes de buscar la aprobación, asegúrese de haber cubierto todos los aspectos importantes de la definición del proyecto:

1. ¿Se ha establecido claramente la organización del proyecto?
2. ¿Se ha identificado al cliente?
3. ¿Se han entendido y aceptado los roles y las responsabilidades?
4. ¿Se han distribuido las declaraciones de responsabilidad y autoridad del proyecto?
5. ¿Se han entendido el contexto estratégico y corporativo, y la prioridad?
6. ¿Se ha preparado y distribuido un gráfico de la organización del proyecto?
7. ¿Se ha obtenido una declaración de requisitos?
8. ¿Se ha preparado y distribuido una lista de accionistas?

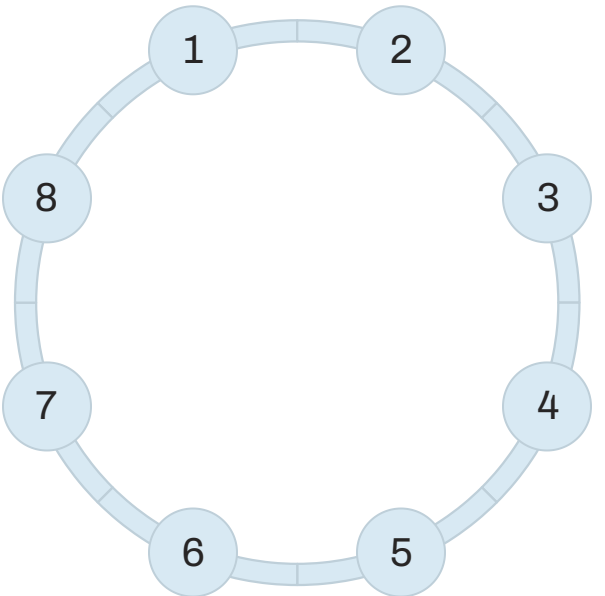

Reflexión integradora

No es lo mismo concebir un proyecto que gestionarlo. En este curso nos enfocamos a la "gestión de proyectos", pero la concepción del mismo muchas veces suele ser crucial para una empresa e, incluso, para la industria. Se juega aquí el concepto de "oportunidad de proyecto", es decir, su razón de ser, su viabilidad y sus resultados.

> ¿Cuáles son los costos de no abordar la concepción y realización de un proyecto?

Reflexiona profundamente respecto de la importancia de algunos proyectos y las consecuencias de no alinearlos correctamente con el negocio.

