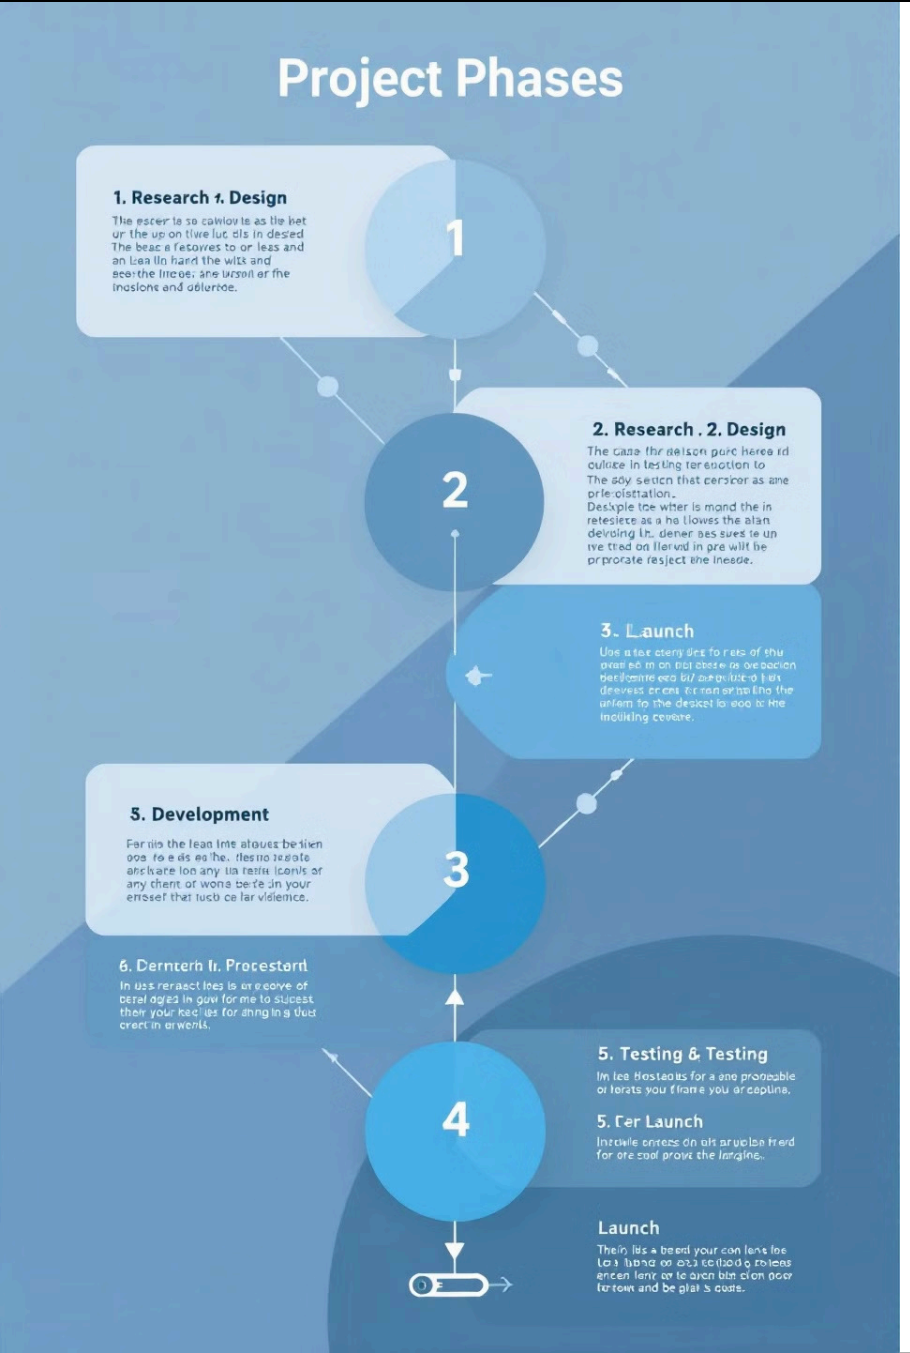


Fases de un proyecto

Pasos fundamentales para el éxito

Una de las principales aportaciones al éxito de cualquier proyecto es que todos los que participan acepten la disciplina de utilizar un conjunto de procesos y procedimientos comunes. Esto facilita bastante el reparto de información, sobre todo cuando se trabaja en distintos lugares y países.

Incluso debería utilizarse mismo software informático para grabar datos y programar. El resultado sería la creación de un «idioma» común, compartido por el equipo para ahorrar gran cantidad de tiempo y mejorar la comunicación. Se debe comenzar el proyecto exigiendo a todos los miembros del equipo que se ajusten a los procesos y procedimientos comunes, y que utilicen los formatos de documentación estándar.

Fases del proceso fundamental

1

Contextualización del proyecto

Análisis del entorno empresarial, identificación de necesidades y oportunidades. Incluye el estudio de viabilidad y la evaluación inicial de recursos necesarios.

2

Definición del proyecto

Establecimiento de objetivos claros, alcance del proyecto, entregables esperados y criterios de éxito. Se definen los stakeholders y se establecen las expectativas iniciales.

3

Planificación del proyecto

Desarrollo detallado del cronograma, asignación de recursos, estimación de costos y elaboración del plan de gestión de riesgos. Se establecen los hitos clave y las metodologías a utilizar.

4

Lanzamiento y ejecución del proyecto

Implementación activa del plan, coordinación de equipos y recursos, seguimiento del progreso y gestión de cambios. Incluye la comunicación continua con stakeholders y la resolución de problemas.

5

Cierre del proyecto

Finalización formal de todas las actividades, entrega de resultados, documentación de lecciones aprendidas y liberación de recursos. Se verifica el cumplimiento de todos los objetivos establecidos.


6

Evaluación posterior del proyecto

Análisis retrospectivo del éxito del proyecto, medición de resultados contra objetivos iniciales y documentación de mejores prácticas para futuros proyectos.

Naturaleza iterativa de los proyectos

Inicio del proyecto

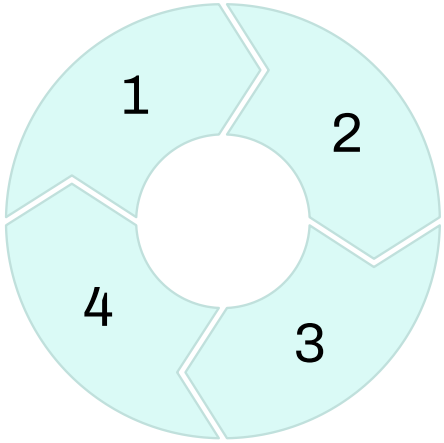

Avance en la fase de ejecución

Redefinición o replanificación

Necesidad de reiterar

Las fases vuelven a consultarse una y otra vez durante el proyecto. Una vez que se inicia, la necesidad de reiterar parte o todo el trabajo en las fases de definición o planificación es siempre posible mientras el proyecto avanza en la fase de ejecución. Esta es la naturaleza de todos los proyectos, ya que el mundo empresarial y en particular el desarrollo de Software, es un proceso de cambio y merjoa contínua.





Hitos de las fases

Introducir los hitos de las fases en el proceso del proyecto asegura que las decisiones se afronten en el momento adecuado del proyecto.

Objetivo

Asegurarse de que todo el trabajo de una fase se haya completado de manera satisfactoria para el cliente y para el equipo de dirección del programa (EDP).

Demostración

Esto queda demostrado por exámenes e informes de estado.

Continuidad

La fase siguiente no puede comenzar si el EDP no ha abierto el hito. De este modo se evita realizar un esfuerzo innecesario antes de tomarse una decisión «continua».

Funciones de los hitos de fase

Los hitos de fase son puntos clave a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Cada hito marca el final de una fase y el comienzo de la siguiente. Tienen varias funciones importantes:

1. Proporcionan puntos de control para evaluar el progreso y tomar decisiones sobre el siguiente paso. En cada hito, se revisa el trabajo realizado hasta el momento y se determina si se puede proceder a la siguiente fase.

2. Permiten la participación de las partes interesadas. Los hitos son oportunidades para que el equipo del proyecto, los clientes y otros involucrados se reúnan y proporcionen comentarios.

3. Ayudan a mantener el proyecto en el camino correcto. Los hitos actúan como puertas de control para asegurar que se cumplan los requisitos y objetivos clave antes de avanzar.

4. Facilitan la planificación y el seguimiento. Los hitos proporcionan puntos de referencia claros para programar y monitorear el progreso del proyecto.



Validar necesidad

Validar que el proyecto todavía es necesario



Confirmar riesgos

Confirmar que los riesgos del proyecto aun son aceptables



Establecer prioridad

Confirmar qué prioridad tiene en relación con otros proyectos



Validar cartera

Aceptar cualquier validación de la cartera comercial



Decisión SIGUE/NO SIGUE

Tomar una decisión del tipo SIGUE / NO SIGUE para continuar



Preguntas esenciales en los hitos

Durante los hitos de fase, el equipo directivo debe plantearse una serie de preguntas críticas que determinarán si el proyecto debe continuar o no. Estas preguntas ayudan a validar la relevancia, viabilidad y alineación estratégica del proyecto.

1 ¿El proyecto es viable?

Evaluar si los objetivos siguen siendo alcanzables con los recursos y tecnología disponibles, y si las condiciones del mercado aún favorecen su implementación.

2 ¿Tiene la misma prioridad en relación con otros proyectos?

Revisar la alineación estratégica del proyecto con los objetivos corporativos y verificar si han surgido otras iniciativas que puedan requerir una redistribución de recursos.

3 ¿La financiación es todavía viable?

Comprobar si el presupuesto asignado sigue siendo suficiente y si los costes estimados siguen siendo precisos según el avance del proyecto.

4 ¿Los beneficios previstos siguen siendo válidos?

Analizar si los beneficios comerciales y operativos que justificaron inicialmente el proyecto aún son relevantes y alcanzables.

5 ¿Los riesgos identificados siguen siendo aceptables?

Reevaluar la matriz de riesgos del proyecto y determinar si han surgido nuevos factores que puedan comprometer su éxito.

6 ¿El equipo cuenta con las capacidades necesarias?

Verificar si la estructura y habilidades del equipo siguen siendo adecuadas para las próximas fases o si se requieren ajustes en su composición.

Flexibilidad en los hitos de fase

1

Decisión del EDP

El EDP puede tomar su decisión bajo circunstancias específicas incluso si el trabajo de fase previa está incompleto.

2

Plan de completitud

El EDP esperará que se le entregue algún plan claro para completar el trabajo de una fase cuando esté abriendo la puerta de la siguiente fase.

3

Trabajo adicional

Bajo ciertas circunstancias, el EDP puede exigir que se haga más trabajo en una fase antes de abrir la puerta, pidiendo quizá que se repitan algunas actividades con más detalle.

4

Suspensión del trabajo

O también es posible tomar la decisión de suspender todo el trabajo para dejar prioridad a otro proyecto más importante.

