

Gestión del tiempo en Gestión de Proyectos

La clave para elaborar un calendario exitoso radica en comprender a la perfección los plazos, asignaciones de personal y dependencias entre tareas. Con frecuencia, los proyectos deben cumplir con fechas límite. En esta etapa, es fundamental que el líder del proyecto evalúe si es factible crear un calendario que se ajuste a la fecha límite establecida. De lo contrario, será necesario posponer el plazo o reorganizar el cronograma.



Cómo Calendarizar mi Proyecto

Para poder realizar un correcto calendario, es necesario:

Conocimiento Preciso

T

ener un preciso conocimiento de los requisitos de tiempo, las asignaciones de personal y las dependencias de unas tareas con otras.

Evaluación de Plazos

Los proyectos a menudo tienen fechas límite. En este punto, el director del proyecto debe evaluar si es posible crear un calendario viable dentro del plazo establecido.

Ajustes

En caso de no ser así, se deberá retrasar el limite o reajustarse los tiempos pautados.

Diagramas Temporales y de Gantt

El **Diagrama de Gantt** es una de las herramientas más utilizadas en la gestión de proyectos. Se trata de una representación gráfica del cronograma del proyecto donde cada actividad es una barra en una línea de tiempo.

Características

Posee barras horizontales en el cual, la lista de actividades van debajo del eje vertical y las fechas se colocan a lo largo del eje horizontal. En el eje corresponde al calendario, o escala de tiempo definido en términos de la unidad más adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, semana, mes, etc.

📌 **Ejemplo de diagrama de Gantt para un sprint de desarrollo:**

Tarea	Duración	Semana 1	Semana 2	Semana 3
Diseño UI	5 días	▇▇▇▇▇		
Desarrollo Backend	10 días		▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇
Pruebas	5 días			▇▇▇▇▇▇▇▇



Ventajas del Diagrama de Gantt

1 **Práctico**

Los diagramas de Gantt son herramientas prácticas muy utilizadas en la administración de proyectos.


2 **Económico**

Son económicas y fáciles de aplicar.

3 **Informativo**

Presentan gran cantidad de información, donde el administrador puede descubrir de inmediato cuáles actividades van adelantadas en la programación y cuáles están atrasadas.

Ejemplo de Diagrama de Gantt

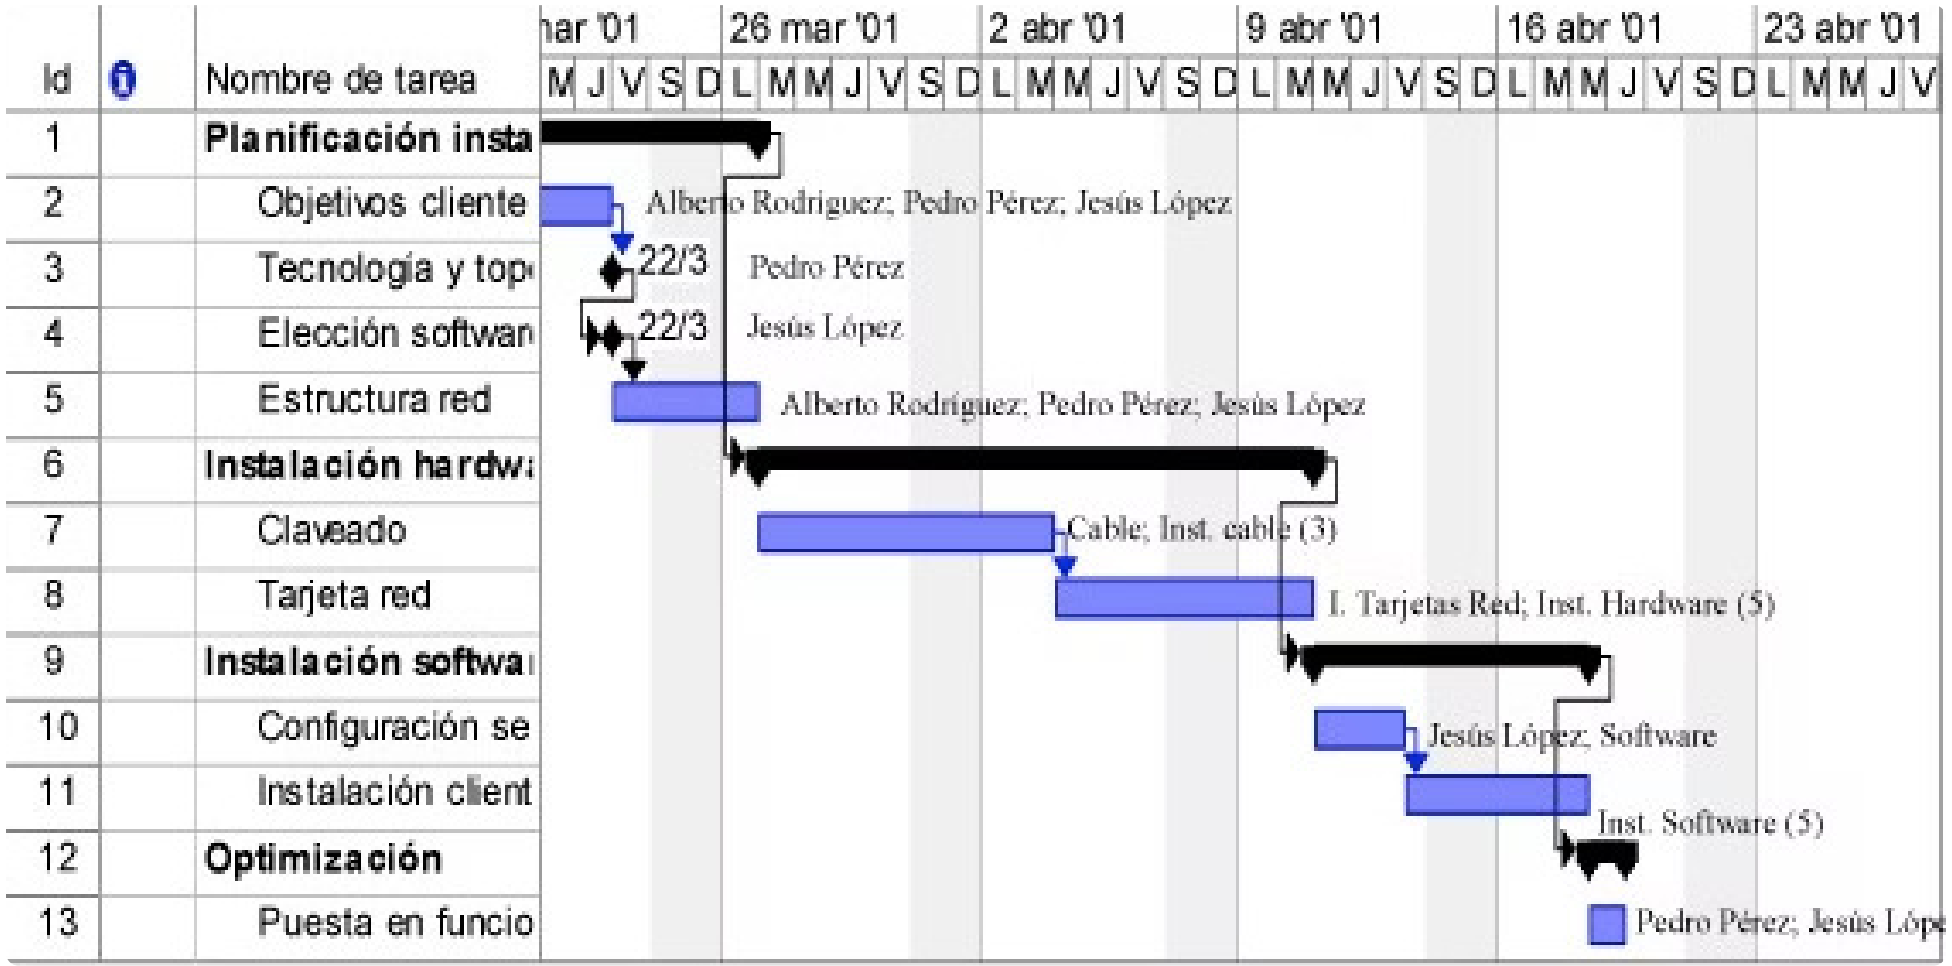

Herramientas Recomendadas para Gantt

La elección de la herramienta correcta es fundamental para una gestión eficiente de los cronogramas de proyecto. Aquí están las opciones más populares y sus casos de uso específicos:



Microsoft Project

- Ideal para proyectos empresariales complejos
- Integración completa con Suite Office 365
- Funciones avanzadas de gestión de recursos
- Mejor opción para equipos grandes



Trello con Power-Ups

- Perfecto para equipos ágiles pequeños
- Interfaz intuitiva y fácil de usar
- Excelente para proyectos visuales
- Integración con múltiples herramientas



Jira

- Especializado en desarrollo de software
- Potente seguimiento de sprints
- Personalización avanzada
- Ideal para metodologías Scrum y Kanban



GanttProject

- Alternativa gratuita y open source
- Funcionalidades básicas pero efectivas
- Perfecto para proyectos pequeños
- Fácil exportación a otros formatos

Al seleccionar una herramienta, considere el tamaño de su equipo, presupuesto, complejidad del proyecto y necesidades específicas de integración con otros sistemas.




YouTube

Crea un DIAGRAMA DE GANTT en SOLO 6min [+Descarga Excel]

¿Luchando con plazos y tareas? Descubre cómo dominar la creación de tu diagrama de Gantt en minutos.Transforma tu planificación con una tabla dinámica y olvídate d...

Para profundizar...



Asana

Diagrama de Gantt: qué es y cómo crear uno con ejemplos [2025] • Asana

Un diagrama de Gantt es una representación gráfica de la evolución de un proyecto. Aprende a crear uno con ejemplos y plantillas de cronogramas.



YouTube

Cómo crear un cronograma DIAGRAMA de GANTT DINAMICO en Exce...

Cómo crear un #Diagrama de #Gantt #Dinámico EN EXCEL, conocidos como organigramas de actividades. _____...

Preguntas Clave para el Cronograma

1 **Finalización**


¿Cuando terminará el Proyecto?

2 **Actividades**

Inicio, fin y duración de una actividad.

3 **Avance**

¿Qué avance de proyecto tendré en tal fecha?

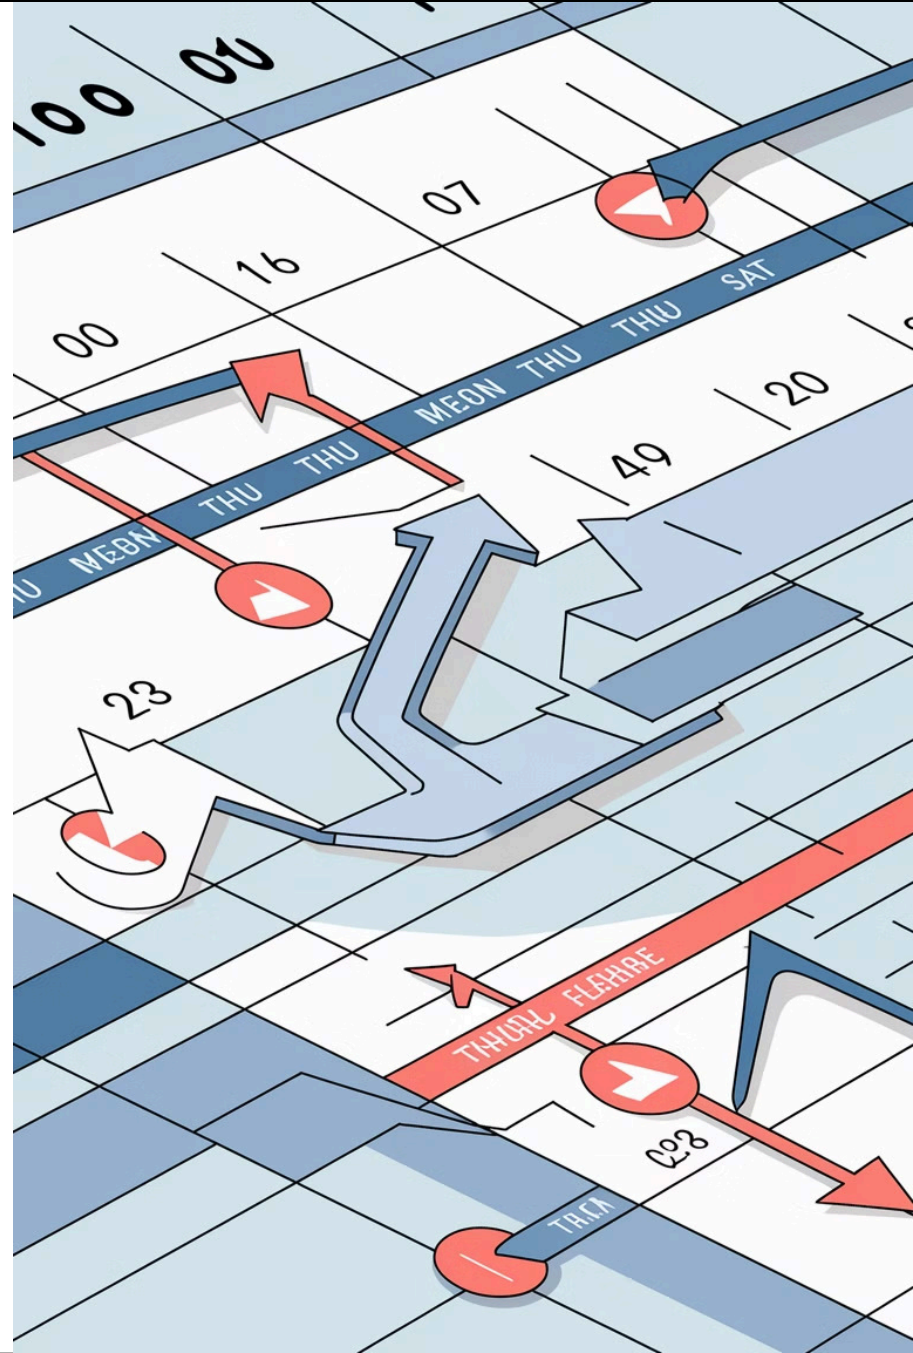



Importancia del Cronograma

Toma de Decisiones

Es importante tener en cuenta que un cronograma sirve para tomar decisiones, por ejemplo, para saber si alguna actividad sufrió un retraso o para pautar también las modificaciones que pueden tener las tareas.

Participación

Otra cuestión importante a tener en cuenta en un proyecto es, **quién necesita participar.** Es necesario que intervengan usted como director e iniciador del proyecto, junto con su equipo.



Planificación Participativa

1 Conformación del Grupo

La planificación es una actividad participativa que contribuye a conformar el grupo y crea una actitud de aceptación de los planes obtenidos.

2 Compromiso

Reflexión: Recuerde que su compromiso y el de todo el equipo es fundamental para un proyecto exitoso.

Preparación para la Planificación

Estudio del Equipo

Antes de comenzar con la planificación es necesario estudiar las capacidades y experiencias de los integrantes del equipo.

Consulta a Expertos

En el caso que sea lo más apropiado, se puede consultar con expertos ajenos, subrayando que esto no los compromete a ocuparse del proyecto desde el principio hasta el final.

Participación de Directivos

Asimismo, se podrá contar con la participación de alguno de los Directores o Accionistas de la Institución para que desde su mirada, aporten al plan.





Asignación de Responsabilidades

1 Definición

Las asignaciones son las asociaciones que se establecen entre tareas concretas y los recursos que se necesitan para completarlas.

2 Flexibilidad

Es posible asignar más de un recurso a una misma tarea. Asimismo, se pueden asignar tanto recursos de trabajo como recursos de material (materiales o suministros consumibles) a las tareas.

Importancia de Asignar Recursos

1 **Seguimiento**

Llevar a cabo un seguimiento de la cantidad de trabajo realizado por las personas y el equipamiento, o la cantidad de material utilizado, en la realización de las tareas.

2 **Responsabilidad**

Garantizar una gran responsabilidad y comprensión del proyecto. Cuando las responsabilidades están claras, existe un menor riesgo de pasar por alto alguna tarea.

3 **Precisión**

Ser más preciso en la programación de la duración de las tareas y de su fecha de finalización.

4 **Control**

Controlar los recursos con sobre asignación o infra asignación de trabajo.

5 **Rendición de Cuentas**

Dar cuenta del tiempo y los costos de los recursos.

Distribución del Trabajo

Objetivo

Este paso es fundamental para asegurarse que el trabajo se hace con puntualidad y para ello, el objetivo es distribuir el trabajo justa y equitativamente en el equipo.

Asignación de Etapas

Es necesario que cada una de las etapas fundamentales pertenezca a uno de los miembros del grupo. Convenza a cada uno para que acepte la función "Propietario de etapa fundamental", para una o varias etapas.



Responsabilidades del Propietario de Etapa

1 **Identificación del Trabajo**

El trabajo que hay que hacer está identificado como una de las detalladas.

2 **Dependencias**

Las dependencias se han identificado con claridad.

3 **Estimación**

La estimación de la duración es exacta con la supervisión constante.

4 **Puntualidad y Calidad**

El trabajo se hace con puntualidad y la calidad necesaria.

5 **Control**

Se mantiene el control regular.

6 **Informes**

Se presenta informes del estado de la actividad.

7 **Comunicación**

Se comunican los problemas y asuntos en el momento indicado.




Responsabilidad Única

Principio

Es importante tener en cuenta que cada etapa fundamental sólo puede tener un responsable, incluso si esa persona asigna algunas de las tareas.

Riesgo

La responsabilidad dividida o múltiple puede llevar a la confusión y a la falta de responsabilidad.

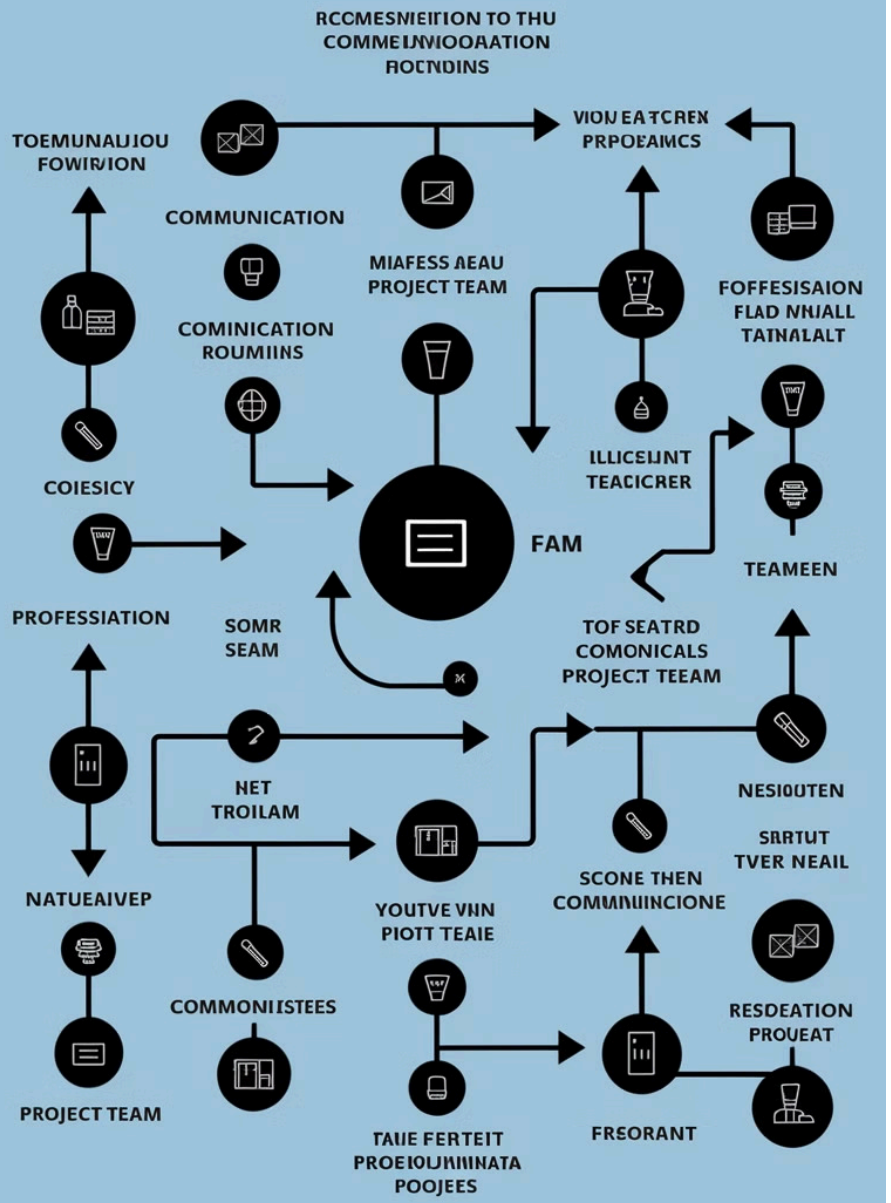

Documento de Comunicación


1 Preparación

Es necesario preparar un documento de comunicación para todos los que participan en el proyecto, incluido los directores de sección de los recursos asignados al plan.

2 Contenido

Su gráfico de responsabilidades debe incluir:

- Una lista de las fases fundamentales y de cada una.
- Quién es el responsable.
- A quién se le debería pedir un consejo.
- A quién se le debería informar sobre la situación.

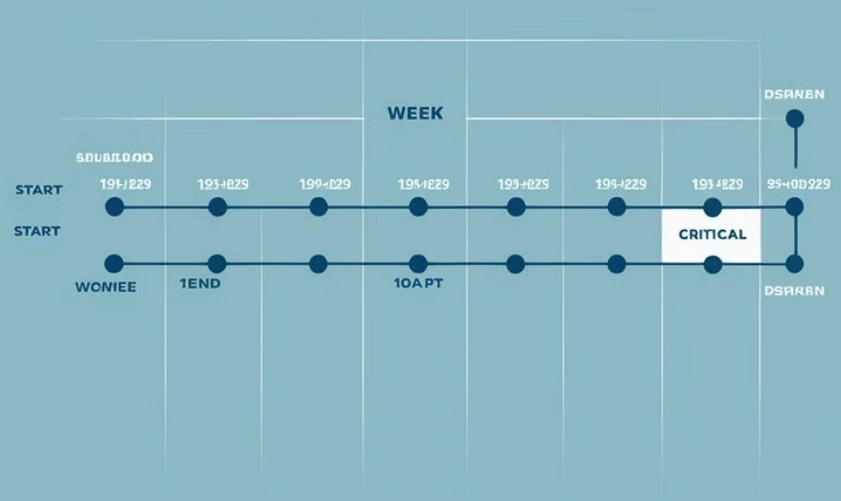

Información Adicional del Documento

1 Fechas

La fecha de comienzo y la fecha de finalización.

2 Criticidad

Si es una actividad crítica.

3 Objetivo

El motivo para asignar estas responsabilidades es asignar el cálculo de las duraciones de las fases fundamentales a aquellas personas de su equipo que, probablemente, tengan la experiencia apropiada o sepan a quién deben consultar para obtener el aporte necesario.



Cálculo del Tiempo de las Etapas

Decisión

Es necesario decidir cuánto tiempo y cuántos recursos se necesitan para llevar a cabo un trabajo con estándares de rendimientos aceptables.

Determinación

Usted deberá determinar el tamaño de la tarea o el grupo de tareas y la cantidad de esfuerzo que se necesita para realizar el trabajo.

Consideraciones para el Cálculo de Tiempo

1 **Días No Disponibles**

Los días no disponibles para el proyecto.


2 **Días No Laborables**

Los días no laborables.

3 **Vacaciones del Personal**

Las vacaciones del personal.

Reflexión: Recuerde que se deben obtener duraciones **realistas** y luego aplicarlas a un calendario para lograr una buena ejecución.

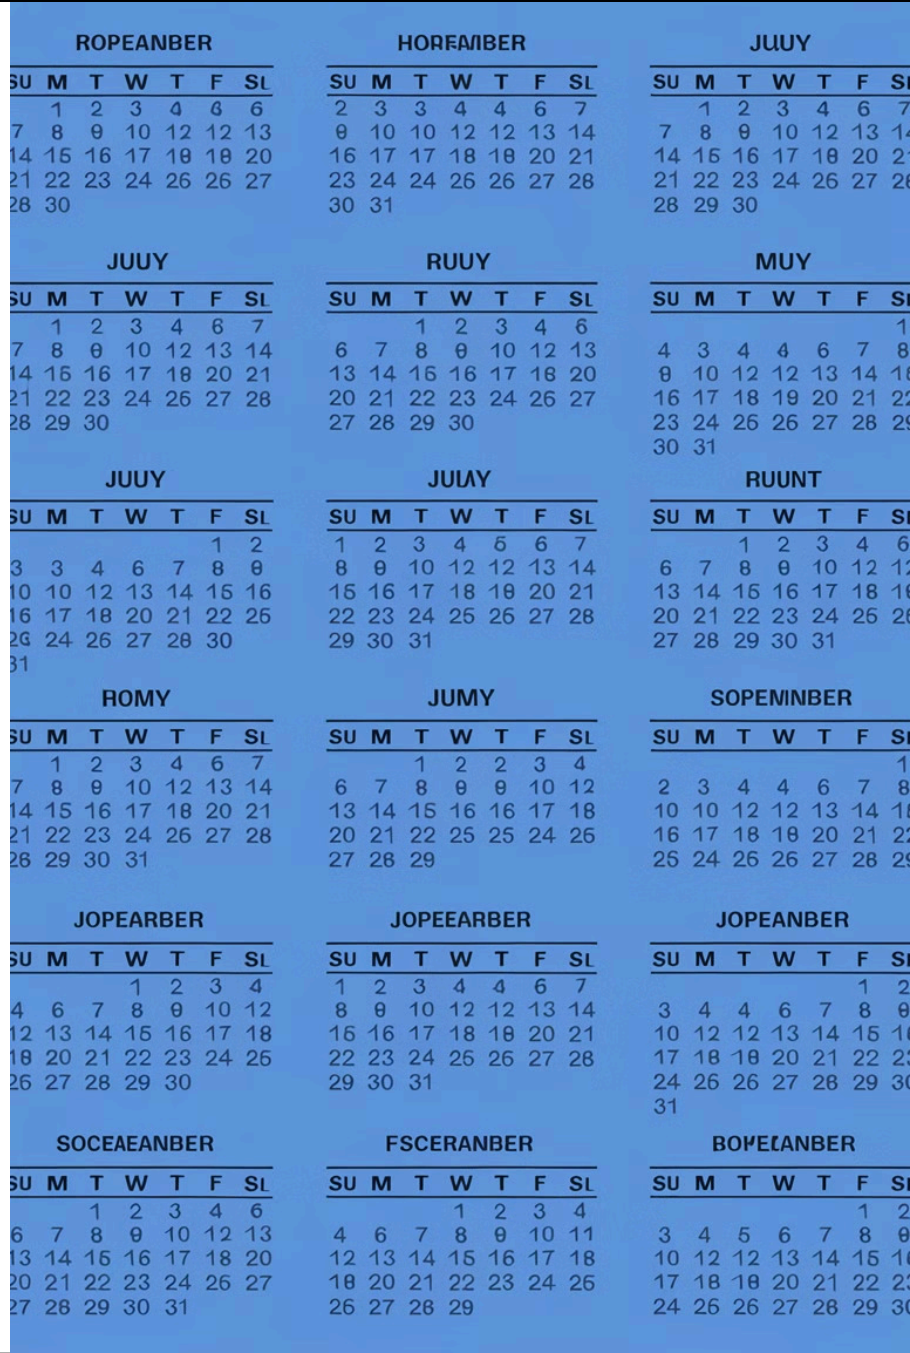

Las tareas

Todo proyecto está compuesto de tareas o de actividades. Para que el proyecto tenga éxito, antes de todo es necesario planificar con cuidado las tareas y luego organizarlas en orden de prioridad.

La siguiente forma puede servir para presentar algunas ideas útiles a su grupo o al personal de proyecto.

Divida a las personas en grupos pequeños y pídales que planifiquen una tarea muy sencilla - como por ejemplo, preparar una taza de té.

Después de cinco minutos pida un informe de los grupos. Converse sobre las diferentes maneras que se usaron para planificar la misma tarea. Pida a los mismos grupos que se formen nuevamente y asígneles una tarea más difícil de planificar - preferiblemente algo relacionado con su trabajo.

Ahora presente la idea de las **Preguntas de los Cinco Dedos**. Si estas preguntas se contestan en el orden correcto, cada tarea se llevará a cabo eficazmente.

- *¿**QUÉ** es la tarea que está planificando? ¿Por qué es necesaria?*
- *¿**CÓMO** se llevará a cabo la tarea? ¿Qué recursos se necesitan?*
- *¿**QUIÉNES** llevarán a cabo el trabajo? ¿Necesitarán capacitación?*
- *¿**DÓNDE** se realizará el trabajo?*
- *¿**CUÁNDO** se llevará a cabo el trabajo? ¿Cuánto tiempo demorará?*
