Enfoques modernos: Selección del proyecto adecuado

La mayoría de los proyectos comienza con una idea inicial, ya sea de un cliente potencial o de la propia empresa. Tales ideas normalmente abundan, excediendo con creces los recursos disponibles o la financiación para que puedan transformarse de forma realista en proyectos activos.

Es fundamental un proceso de investigación si la empresa no quiere comprometer sus recursos sin la garantía de llegar a conseguir los resultados buscados. Puede realizarse un comunicado escrito o, simplemente, tomar una decisión directiva para obtener la cartera de negocio inicial. Como regla general, es preferible obtener la cartera de negocio inicial como una base para que se tomen las decisiones con conocimiento de causa.



Enfoques para la selección de proyectos

Hay 2 enfoques fundamentales en el proceso de selección:

Modelo cuantitativo

Genera datos numéricos y medibles para evaluar los proyectos potenciales.

Modelo cualitativo

Se basa en criterios no numéricos y más subjetivos para evaluar los proyectos.

El papel del Equipo de Dirección de Proyectos (EDP)

La selección es decisión última de la dirección general a través del Equipo de Dirección de Proyectos (EDP), que necesita que usted le proporcione datos para tomar tal decisión. Seleccionar el proyecto equivocado puede precipitar el fracaso.


1. Funciones del EDP
2. Controlar la investigación inicial de ideas y oportunidades
3. Aprobar proyectos para un escrutinio más detallado
4. Examinar la cartera de negocio completa
5. Tomar decisiones sobre la viabilidad de los proyectos

Preguntas clave para la selección de proyectos

1. ¿El proyecto propuesto va a aumentar al máximo los beneficios?
2. ¿El proyecto mantendrá o consolidará la participación en el mercado?
3. ¿El proyecto abrirá nuevos mercados?
4. ¿El proyecto incrementará al máximo la utilización de los recursos existentes?
5. ¿El proyecto aumentará el uso de la capacidad de fabricación existente?
6. ¿El proyecto levantará la imagen de la empresa?
7. ¿Aumentará el riesgo que afronta la empresa?
8. ¿Está el campo del proyecto dentro de la experiencia y las capacidades actuales de la empresa?

Factores a considerar en la selección de proyectos

El modelo se puede construir de modo más riguroso sopesando unos factores como más importantes que otros, indicando su valor al contribuir a los objetivos de la empresa en ese momento. Se puede desarrollar una lista detallada de factores basada en:

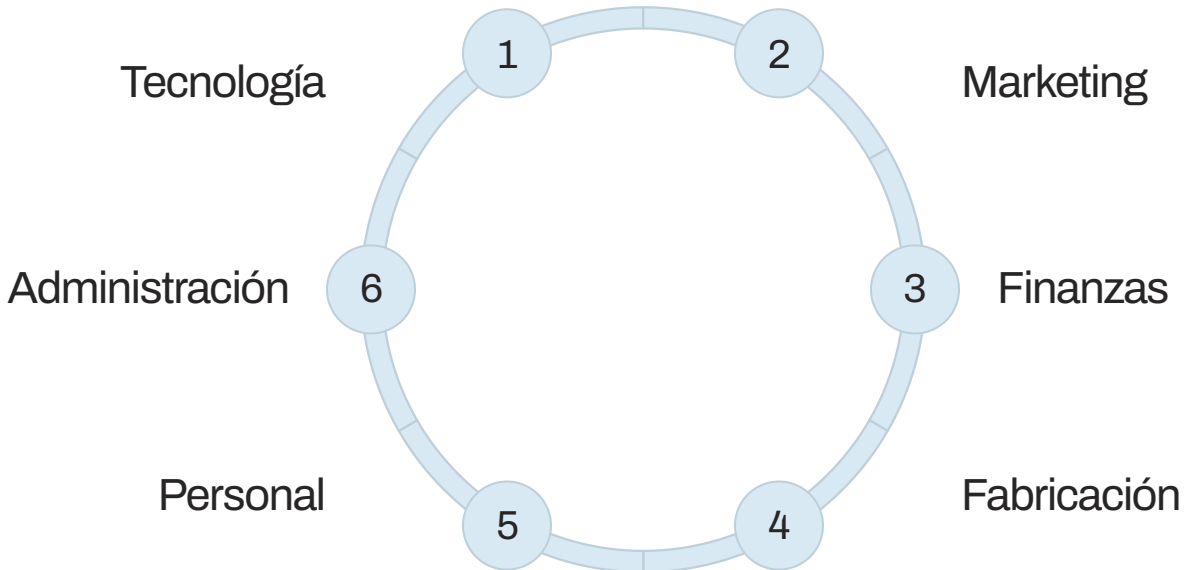

Modelos cuantitativos para la selección de proyectos

La mayoría de los modelos cuantitativos se centrará en datos financieros para respaldar la cartera. Los datos generados varían bastante, pero incluyen información sobre:

1. Datos financieros comunes
2. Rendimiento del capital
3. Rendimiento de los activos netos
4. Período de devolución
5. Valor presente neto
6. Tasa interna de rentabilidad
7. Análisis de coste / beneficio
8. Análisis de sensibilidad
9. Datos del mercado



La importancia de la cartera de negocio

> La cartera de negocio es un documento de control clave como la carta fundamental para el proyecto, y debe ser objeto de revisión, examen y actualización regularmente.

Es importante mantener actualizada la cartera de negocio a lo largo del proyecto, completando y mejorando los datos a medida que se dispone de más información. Preste atención a la configuración, y grabe todas las revisiones y todo lo que añada.

El proceso de puesta en marcha

Antes de sumergirse activamente en un proyecto, es prudente estudiar toda la información disponible para asegurarse de que el proyecto no empieza en la dirección equivocada. En esta etapa, debería tener claro:

1. Elementos clave
2. Quién es su patrocinador
3. Quiénes son los clientes y los posibles clientes secundarios
4. Quién utilizará los resultados
5. El equipo central del proyecto inicial o los posibles candidatos
6. Otras personas que pueden influir en el proyecto (los accionistas)

Necesidades y expectativas del cliente

Definir las necesidades del cliente pone en marcha un proceso que, al final, le permitiría producir comunicados específicamente diseñados para cumplir las expectativas del cliente. Una vez que usted haya entendido con claridad las prioridades, puede desarrollar los requisitos del proceso de planificación.

1. Entender al cliente y sus prioridades
2. Comprender el entorno del cliente
3. Usar técnicas políticas
4. Demostrar competencia técnica
5. Transformar necesidades poco definidas en soluciones prácticas
6. Mantener una mente abierta y creativa
7. Analizar señales mixtas sobre necesidades específicas
8. Exponer expectativas ocultas

El contrato del cliente

Como director de proyecto, usted tiene la obligación de convertir su relación con el cliente en una forma de contrato. Normalmente no se redacta un documento formal firmado por todas las partes, sino que se trata de un acuerdo informal.

1. Elementos del contrato
2. Definición de roles y responsabilidades
3. Acuerdo sobre obligaciones mutuas
4. Enfoque en conseguir los resultados acordados
5. Clarificación de las expectativas del cliente
6. Definición de plazos y entregables

Las limitaciones del proyecto

Las restricciones limitan todas las actividades del proyecto. En el ámbito empresarial es raro tener recursos, financiación y tiempo ilimitados para completar un trabajo.

Financieras

Es importante considerar los costes asociados al proyecto, incluyendo los materiales y recursos necesarios. También debemos tener en cuenta los ingresos esperados del proyecto.

Tiempo

Otro aspecto clave es el plazo para entregar los resultados. Debemos establecer fechas realistas y asegurarnos de cumplir con los plazos acordados.

Calidad

Por último, debemos prestar especial atención a las especificaciones y estándares que el proyecto debe cumplir. La calidad de los entregables es fundamental para satisfacer las necesidades del cliente.

Suposiciones en el proyecto

Al comenzar el proyecto, es inevitable que se hagan muchas suposiciones acerca de varios aspectos del mismo. Normalmente están asociadas con las áreas de mayor complejidad o más desconocidas.

> Las suposiciones invalidadas llegan a ser temas que influyen en el progreso del proyecto y deben resolverse a tiempo.

1. Manejo de suposiciones
2. Identificar y documentar todas las suposiciones
3. Validar las suposiciones a lo largo del proyecto
4. Convertir suposiciones en temas a resolver cuando sea necesario
5. Informar al EDP sobre las suposiciones hechas

Volver a la Unidad
