

Gestión de proyectos: Las 7 mejores prácticas

Gestionar un proyecto puede ser una tarea desalentadora. Ya se trate de planificar su boda, desarrollar un nuevo website para su empresa o construir su casa soñada a orillas del mar, usted **necesita emplear técnicas de gestión de proyectos** (*project management* en la bibliografía en inglés) que le ayuden a tener éxito.

Resumimos **las 7 mejores prácticas (best practices)** principales que constituyen la clave de toda **buena gestión de proyectos** y que colaborarán a su éxito.

1. Defina el Alcance y los objetivos del proyecto

Entender los objetivos

Primero entienda los objetivos del proyecto. Suponga que su jefe/a le pide que organice una campaña de donantes de sangre, ¿Cuál es el objetivo: obtener la mayor cantidad de sangre posible? O es ¿levantar el perfil local de la empresa? Decidir cuáles son los objetivos reales le ayudará a planificar el proyecto.

Definir los límites

El alcance o área de competencia define los límites del proyecto. Decidir qué es lo que está dentro o fuera de los límites del proyecto determinará la cantidad de trabajo que se necesitará realizar.

Involucrar a los interesados

Entienda quiénes son los interesados, qué producto esperan que se les entregue y consiga su respaldo. Una vez que tenga el alcance y los objetivos del proyecto definidos, deje que los ellos mismos los revisen y le presten su acuerdo.

2. Defina las Tareas

1

Identificación de tareas tangibles

Debe definir que tareas se esperan del proyecto. Si por ejemplo su proyecto es una campaña publicitaria para una nueva barra de chocolate, entonces una tarea sería producir el trabajo de arte para la publicidad. Por eso defina que cosas tangibles deben ser producidas y documéntelas con suficiente detalle para que cualquiera de los involucrados pueda llevarla a cabo correcta y eficientemente.

2

Revisión por accionistas

Los accionistas claves deben revisar la definición de las tareas y estar de acuerdo que las mismas reflejan adecuadamente lo que se espera.



3. Planifique el Proyecto

Definir recursos necesarios

Planificar requiere que el gerente de proyecto decida qué gente, recursos y presupuestos se requieren para completar el mismo.

Utilizar técnicas de descomposición

Usted debe definir qué actividades se requieren para producir los productos, utilizando técnicas tales como **Estructura Analítica de Proyectos (WBS – Work Breakdown Structure)**. En el gererenciamiento de proyectos, el WBS es una técnica que consiste en la descomposición del proyecto en partes manejables).

Estimar tiempos y establecer hitos

Usted debe estimar los tiempos y los esfuerzos requeridos para cada actividad, las dependencias entre actividades y luego decidir un programa realista para completarlas. Involucre al equipo de proyecto en la estimación de la duración de las actividades. Establezca hitos que indiquen fechas críticas durante el desarrollo del proyecto. Escríbalas en su planificación. Pida a los accionistas principales que la revisen y presten su consentimiento al plan.



4. Comunicación

Compartir el plan

La planificación del proyecto resulta inútil si no es comunicada efectivamente al equipo de proyecto. Cada miembro del equipo necesita conocer sus responsabilidades.

Evitar errores comunes

Una vez trabajé en un proyecto en donde el project manager se quedó sentado en su escritorio rodeado de un enorme cronograma. El problema fue que nadie en ese equipo sabía cuáles eran las tareas y las fechas tope, pues nadie había compartido la planificación.

Consecuencias

El proyecto sufrió todo tipo de problemas porque la gente hacía actividades que pensaban que eran importantes en vez de hacer las que el director de proyecto les había asignado.

5. Seguimiento y Reporte de Avance del Proyecto

1

Monitoreo continuo

Una vez que el proyecto esté en ejecución usted debe monitorearlo y comparar el progreso actual con el proyectado. Necesitará reportes de avance de proyecto que deberán producir los miembros del equipo.

2

Registro de variaciones

Usted deberá registrar las variaciones entre lo real y lo proyectado, tanto en lo referente a costos, como a cronograma y al alcance. Deberá reportar las variaciones a su superior y a los accionistas claves para poder tomar acciones correctivas antes de que esos desfasajes sean demasiado grandes.

3

Ajuste del plan


Puede ajustar el plan de muchas maneras para volver a poner la planificación en el camino trazado pero siempre terminará equilibrando costos, cronograma de tareas y alcances.

4

El triángulo del proyecto

Si el director de proyecto cambia una de estas, entonces uno o los dos elementos restantes deberán inevitablemente ajustarse de forma acorde. Es justamente el balance estos tres elementos – conocidos como el triángulo del proyecto- lo que típicamente causa los mayores dolores de cabeza al manager de proyecto.

El Triángulo del Proyecto

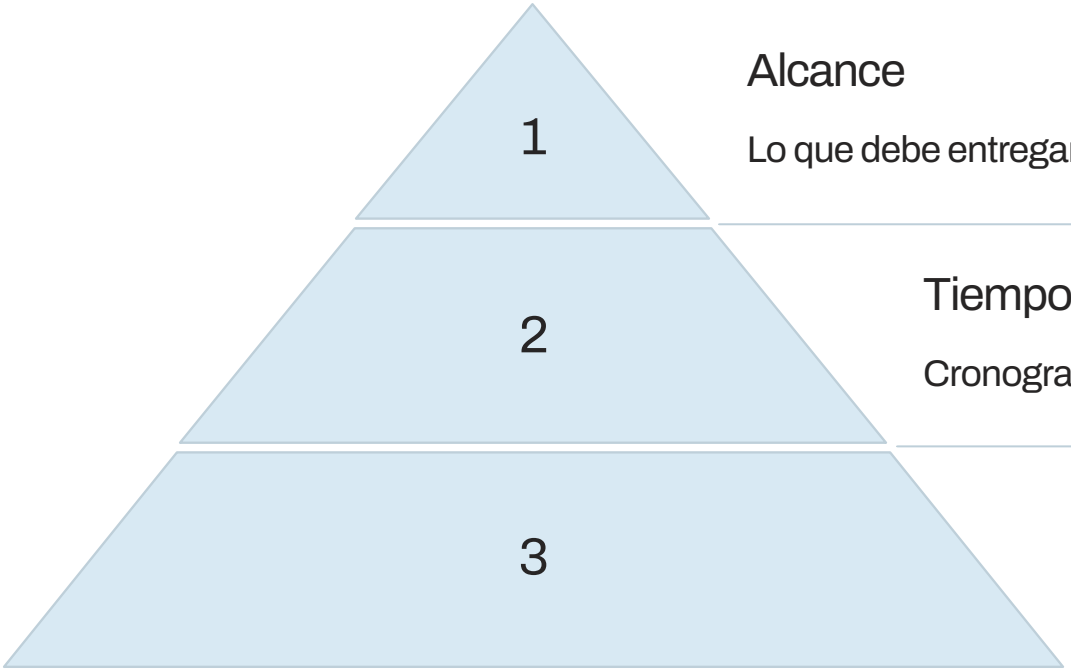

Alcance

Lo que debe entregarse

Tiempo

Cronograma de tareas

Costo

Presupuesto disponible

El triángulo del proyecto representa los tres elementos fundamentales que todo gestor de proyectos debe equilibrar. Si se modifica uno de estos elementos, inevitablemente se verán afectados los otros dos. Por ejemplo, si aumenta el alcance del proyecto, necesitará más tiempo o más recursos (costo). Este equilibrio constante es lo que genera los mayores desafíos en la gestión de proyectos.

6. Gestión del Cambio

1

Cambios de parecer

Los accionistas a menudo cambian de parecer en lo que respecta a las áreas de cada proyecto. A veces cambia el entorno de negocios en medio del desarrollo, y los supuestos que se hicieron al comenzar no siempre siguen siendo válidos.

2

Implicaciones

Esto a veces implica que el cronograma o las tareas deban ser cambiados. Si el manager del proyecto acepta todos los cambios, muy probablemente el proyecto se saldrá de presupuesto, se atrasará y hasta podría no terminarse.

3

Toma de decisiones

Administrando los cambios, el líder de proyecto puede tomar decisiones sobre si incorporar o no los cambios inmediatamente o en el futuro, o directamente rechazarlos.

4

Beneficios

Esto aumenta las posibilidades de que el proyecto sea exitoso porque el project manager controla la forma en que esos cambios son incorporados, puede disponer nuevos recursos acordes al cambio y puede planificar cuando y como se harán los mismos.

5

Consecuencias

Una de las razones por lo que a veces fracasan los proyectos es por la imposibilidad de gestionar los cambios eficientemente.

7. Gestión del Riesgo

Definición de riesgos

Los riesgos son eventos que pueden afectar negativamente su proyecto. He trabajado en proyectos en lo que los riegos incluyeron: un plantel laboral que no tenía las habilidades técnicas requeridas para realizar el trabajo, la falta de entrega a tiempo de hardware u otros equipos, una sala de control con riesgo de inundación y muchos otros.

Identificación temprana

Los riesgos varían con cada proyecto pero se debe identificar lo antes posible los riesgos del proyecto en particular. Se debe planificar para evitar los riesgos o, si los riesgos no pueden ser evitados, para mitigar su impacto en el proyecto en caso de que efectivamente ocurra. Esto se conoce como gestión del riego (Risk management).


Priorización

Usted no controla todos los riesgos porque estos pueden ser muchos y no todos tienen el mismo impacto.

Evaluación de Riesgos

Identificar todos los riesgos

Listar todos los posibles eventos negativos

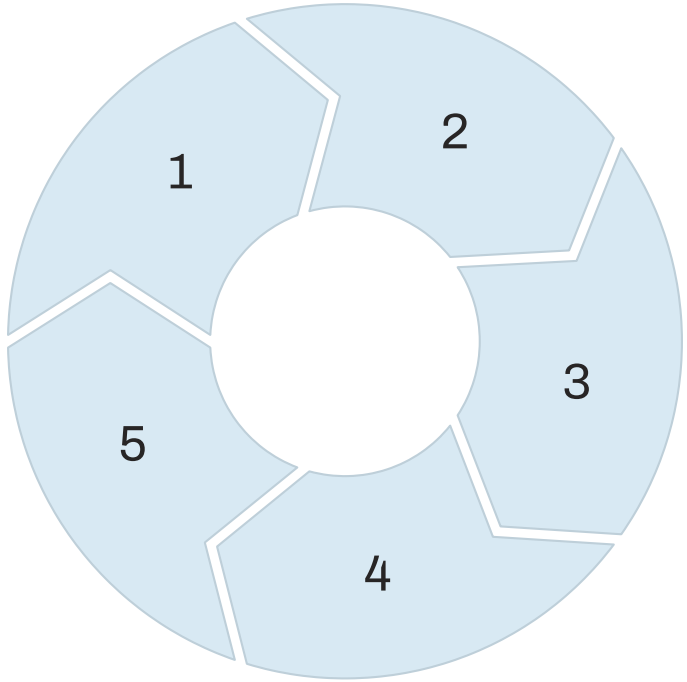

Estimar probabilidades

1= no probable; 2= posible; 3= muy probable

Estimar impacto

1= bajo; 2= medio; 3= alto

Calcular factor de riesgo


Multiplicar probabilidad por impacto

Gestionar los más críticos

Enfocarse en los 10 con mayor factor

Luego multiplique ambos números para tener un factor de riesgo. Los factores de riego alto indican los riesgos más severos y, por lo tanto, las situaciones más problemáticas. Gestiones los 10 con los mayores factores de riesgo. Revise constantemente los riesgos y esté alerta por nuevos que pudieran surgir pues tienen la manía de aparecer cuando menos los esperamos.

No gestionar los riesgos eficientemente es otra de las causas frecuentes de fracaso de los proyectos.

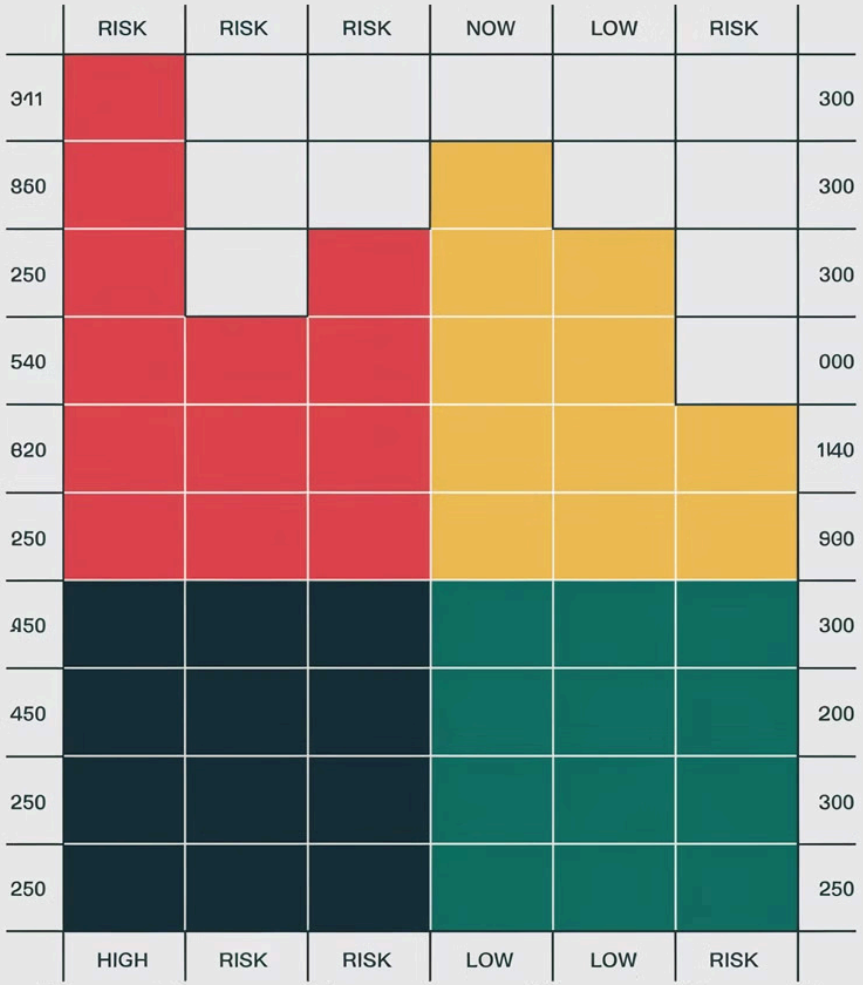

Matriz de Evaluación de Riesgos

Probabilidad / Impacto	Bajo (1)	Medio (2)	Alto (3)
No probable (1)	1	2	3
Posible (2)	2	4	6
Muy probable (3)	3	6	9

Esta matriz de evaluación de riesgos muestra cómo calcular el factor de riesgo multiplicando la probabilidad por el impacto. Los riesgos con factores más altos (6-9) requieren atención inmediata y planes de mitigación detallados, mientras que los riesgos con factores medios (3-4) deben ser monitoreados regularmente. Los riesgos con factores bajos (1-2) pueden ser simplemente observados sin necesidad de acciones específicas.

Ejemplos de Riesgos Comunes en Proyectos



Falta de habilidades técnicas

Un plantel laboral que no tiene las competencias necesarias para realizar las tareas técnicas requeridas por el proyecto, lo que puede resultar en retrasos significativos.



Retrasos en entregas

La falta de entrega a tiempo de hardware u otros equipos necesarios para avanzar con las fases críticas del proyecto.



Riesgos ambientales

Situaciones como una sala de control con riesgo de inundación que podrían comprometer la infraestructura física del proyecto.

Estos son solo algunos ejemplos de los muchos riesgos que pueden afectar a un proyecto. La naturaleza de los riesgos variará según el tipo de proyecto, la industria y el contexto específico en el que se desarrolle.

Monitoreo Continuo de Riesgos

1

Revisión periódica

Evaluar regularmente

2

Identificación de nuevos riesgos

Estar alerta a cambios

3

Actualización de planes

Ajustar estrategias

Revise constantemente los riesgos y esté alerta por nuevos que pudieran surgir pues tienen la manía de aparecer cuando menos los esperamos. El monitoreo continuo es esencial porque el entorno del proyecto puede cambiar, introduciendo nuevos riesgos o modificando la probabilidad o impacto de los riesgos ya identificados. Un buen gestor de proyectos mantiene una vigilancia constante y ajusta sus estrategias de mitigación según sea necesario.

Factores de Éxito en la Gestión de Proyectos

7

Mejores prácticas

Las siete prácticas fundamentales que hemos revisado constituyen la base de una gestión de proyectos exitosa.

3

Elementos del triángulo

Alcance, tiempo y costo son los tres elementos fundamentales que deben mantenerse en equilibrio.

10

Riesgos principales

Gestionar los diez riesgos con mayor factor de impacto es clave para prevenir problemas mayores.

Estos números representan aspectos cuantitativos importantes en la gestión de proyectos. Seguir las 7 mejores prácticas, equilibrar los 3 elementos del triángulo del proyecto y gestionar los 10 riesgos principales son factores determinantes para aumentar significativamente las probabilidades de éxito de cualquier proyecto.

Volver a la Unidad

